



NDËRMARRJA HIDROEKONOMIKE "IBËR - LEPENC" SH.A.

HYDRO - ECONOMIC ENTERPRISE "IBËR - LEPENC" J.S.C.

VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE "IBËR - LEPENC" D.D.



## Raporti tre mujor, Janar-Mars 2026 TM1

Bordi i Drejtorëve në mbledhjen e katër (4) të rregullt të mbajtur me datë 12.05.2026 pas shqyrtimit të Raportit TM1-2026 mbi zhvillimet e aktiviteteve afariste në NPH "Ibër Lepenc" Sh.A, mori vendim për miratimin e këtij raporti dhe kërkoi që i njëjti të përcillet në NJPMNP.

	Delegoi	Aprovoi
Emri Mbiemri	Kryeshefi Ekzekutiv:	Kryesuesi i BD:
Nënshkrimi	<b>Faruk MUJKA</b>	<b>Bajram MUSTAFA</b>
Data: 12.05.2026		





NDËRMARRJA HIDROEKONOMIKE "IBËR - LEPENC" SH.A.

HYDRO - ECONOMIC ENTERPRISE "IBËR - LEPENC" J.S.C.

VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE "IBËR - LEPENC" D.D.

Sheshi "Bill Klinton" Nr.13 - Prishtinë, Republika e Kosovës  
Tel: 038/526-070, 525-006, Fax: 038/526-159; Email: [info@iber-lepenc.org](mailto:info@iber-lepenc.org)

---

**Për :** Bordin e Drejtorëve  
**Nga:** Faruk Mujka - Kryeshef Ekzekutiv – N.H "Ibër-Lepenc" Sh.A  
**Lënda:** Raport tremujor i punës: Janar-Shkurt-Mars 2026  
**Data:** 25.04.2026

---

## ***RAPORT TREMUJOR***



***Janar-Shkurt-Mars 2026***

## PËRMBATJA

1. Hyrje .....	3
2. Aktivitetet e Departamenteve .....	4
2.1. Departamenti „Uji dhe Gjenerimi” .....	4
2.2. Departamenti “Ujitja” .....	14
2.3. Shërbimi i Financave .....	16
2.4. Zyra e Prokurimit.....	20
2.5. Departamenti i Shërbimeve të Përbashkëta .....	22
2.6. Departamenti Planifikim dhe Zhvillim.....	24
2.7. Njësia zbatuese e projektit WSCP .....	28

## 1. Hyrje

Gjatë tremujorit të parë për vitin 2026(TM1) kemi pas mjaft angazhime dhe sfida që i kemi kryer me përkushtim, duke arritur suksese të dukshme . Por kjo nuk do të thotë që ne duhet të ngadalësojmë hapin në rrugëtimin tonë . Prandaj këtë vit do të vazhdojmë punën me një përkushtim edhe më të madh, drejt realizimit të qëllimeve bazuar në Planin e biznesit .

Nga zyra e shitjes kam pranuar këtë pasqyrë të punës , paraqitur në tabelat si në vijim :

TM1 Shitja e Energjisë Elektrike	
Muaji	Vlera €
Janar 2026	€ 1,170,647.08
Shkurt 2026	€ 900,395.75
Mars 2026	€ 899,352.89
<b>Total</b>	<b>€ 2,970,395.71</b>

TM1 Shitja e Ujit të Papërpunuar	
Muaji	Vlera €
Janar 2026	€ 158,337.48
Shkurt 2026	€ 163,851.35
Mars 2026	€ 181,224.56
<b>Total</b>	<b>€ 503,413.39</b>




## 2. Aktivitetet e Departamenteve

### 2.1. Departamenti „Uji dhe Gjenerimi”

Gjatë tremujorit të parë (TM1), periudha Janar-Mars, në departamentin “Uji dhe Gjenerimi” është punuar intensivisht në mirëmbajtjen e kanalit kryesor për të siguruar rrjedhën e pandërprer të ujit dhe furnizimin me ujë për konsumatorët e ndërmarrjes, kjo periudhë karakterizohet me kushte hidrometeorologjike aktive: janari dhe shkurti shënuan prurje shumë mbi mesatare (14.9 dhe 11.3 m<sup>3</sup>/s), tejkalim të ndjeshëm të planit, ndërsa marsi pati prurje më të moderuara (10.03 m<sup>3</sup>/s) me prodhim nën plan. Gjithashtu, në përputhje me kërkesat e shfrytëzuesëve të ujit nga sistemi i IL-it, gjatë kësaj periudhe tremujore janë shpërndarë/distribuar gjithsej **13,761,748**, NewCo Ferronikel LLC ka ndërprerë marrjen e ujit nga dhjetori 2025 dhe nuk figuron në TM1 2026.


TM1	m <sup>3</sup>
KRU Mitrovicë	4,557,356
KRU Mitrovicë ( Vushtrri)	1,798,123
KUR Prishtina(Shkabaj)	3,993,000
KUR Prishtina(Drenas)	691,669
KOSOVA B	2,721,600
<b>Totali</b>	<b>13,761,748</b>

Paraqitja grafike e sasive të distribuara të ujit në m<sup>3</sup> janar-mars 2026

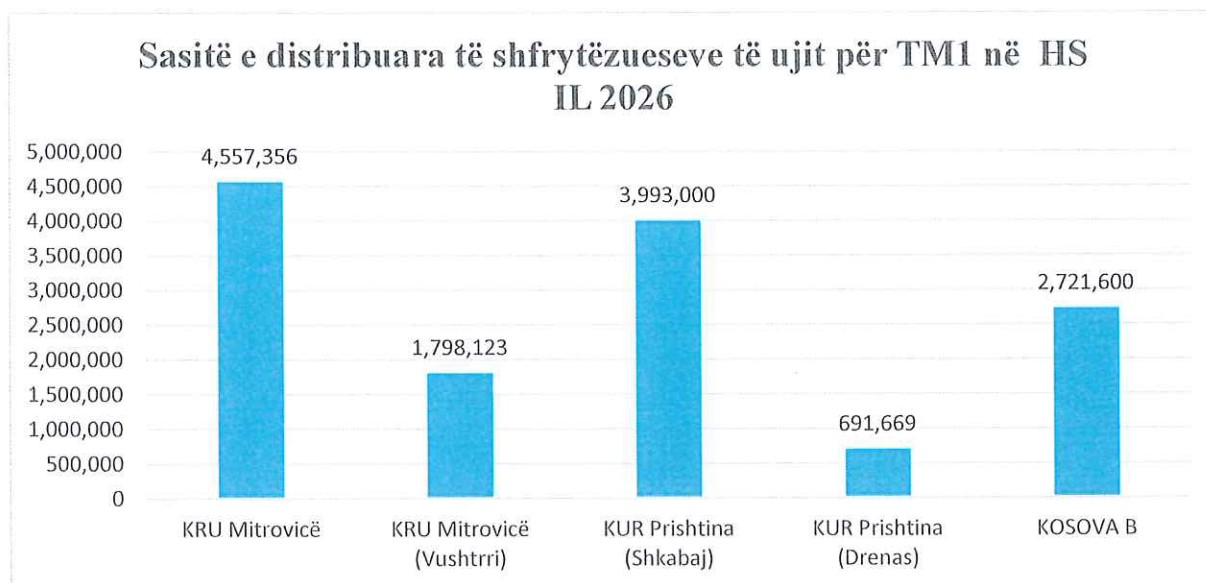Paraqitja grafike e sasive të distribuara të ujit në m<sup>3</sup> janar-mars 2026

\* NewCo Ferronikel CoL.L.C ka ndërprerë marrjen e ujit nga Dhjetori 2025.

Konsumatori	2022	2023	2024	2025	2026	Δ 2026 vs 2025
KRU Mitrovicë	5,310,357	4,751,622	4,835,579	4,835,579	4,557,356	-278,223
KRU Mitrovicë (Vushtrri)	1,649,265	1,696,841	1,817,955	1,817,955	1,798,123	-19,832
KUR Prishtina (Shkabaj)	4,261,384	2,935,360	4,006,800	4,006,800	3,993,000	-13,800
KUR Prishtina (Drenas)	928,890	726,899	791,968	791,968	691,669	-100,299
KOSOVA B	2,543,400	2,721,600	2,721,600	2,721,600	2,721,600	0
NewCo Ferronikel CoL.L.C	243,566	259,760	388,379	388,379	0	-388,379
<b>TOTALI</b>	<b>14,936,862</b>	<b>13,092,082</b>	<b>14,562,281</b>	<b>14,562,281</b>	<b>13,761,748</b>	<b>-412,154</b>

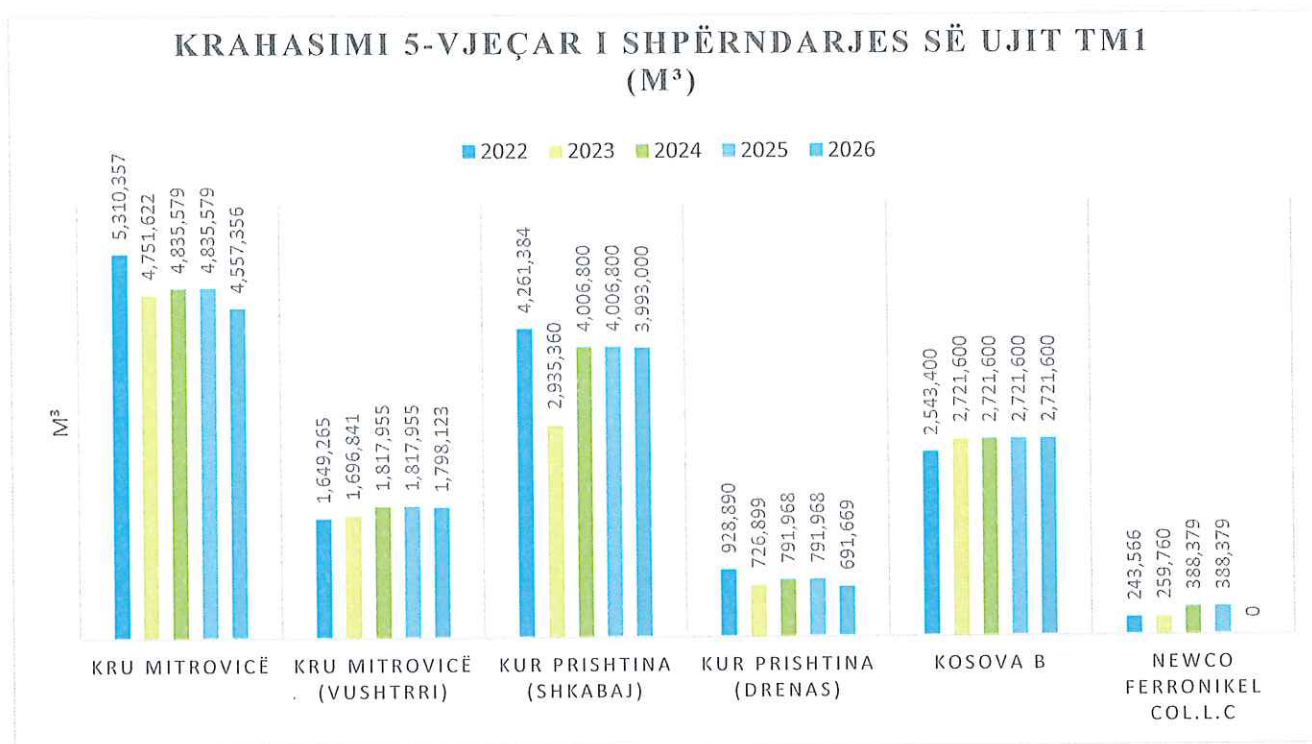



Gjatë kësaj periudhe të tremujorit Janar-Mars nga HC Ujëmani janë gjeneruar **26,755.56 MWh** gjegjësisht **26,370.63 MWh** (injektuar/plasur në sistemin transmetues, koeficienti i humbjes), apo **34% (20,000 MWh)** më shumë se planifikimi.

**Janar:** janë gjeneruar 9,028.94 MWh, apo 64% më shumë se planifikimi (5,500 MWh), si pasojë e prurjeve të larta mesatare (14.9 m<sup>3</sup>/s).


**Shkurt:** janë gjeneruar 11,453.98 MWh, apo 91% më shumë se planifikimi (6,000 MWh), si pasojë e prurjeve mesatare 11.3 m<sup>3</sup>/s.

**Mars:** janë gjeneruar 6,272.64 MWh, apo 26% më pak se planifikimi (8,500 MWh), si pasojë e mungesës relative të prurjeve (10.03 m<sup>3</sup>/s).

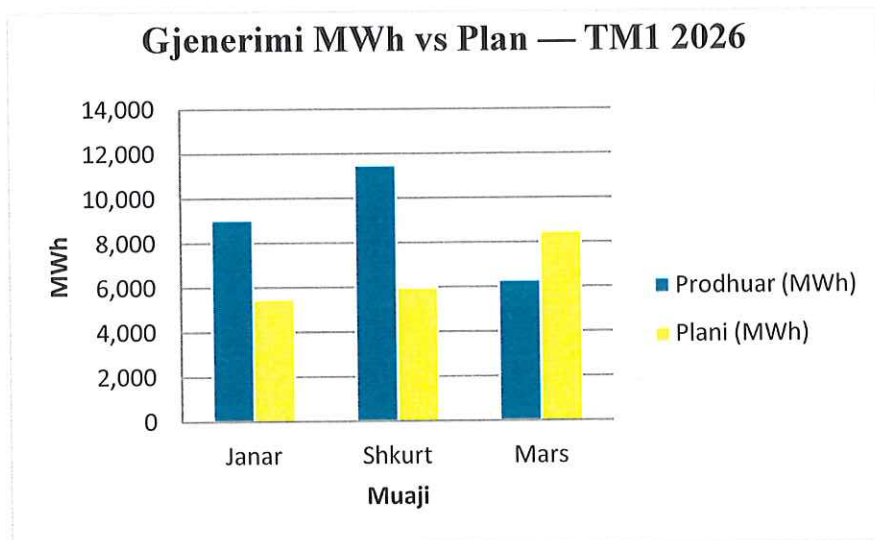

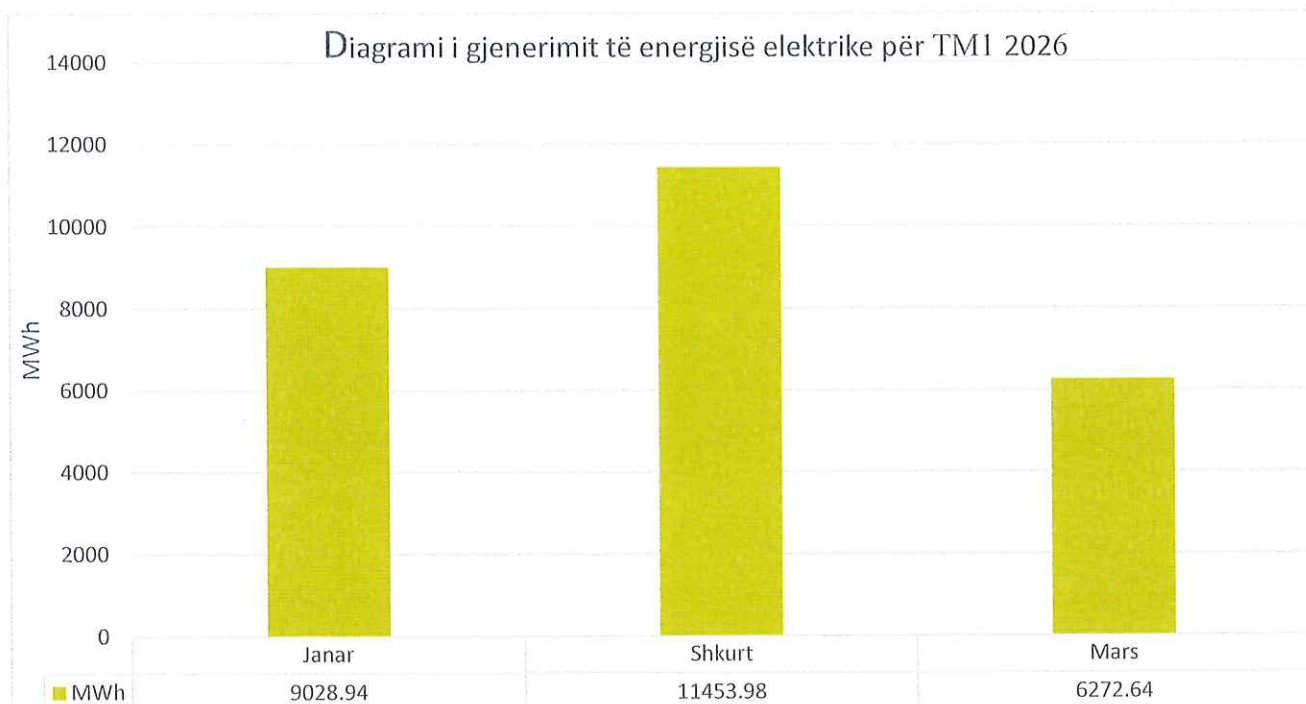

<b>KRAHASIMI HISTORIK — GJENERIMI TM1 (MWh)   2016–2026</b>				
Viti	Janar (MWh)	Shkurt (MWh)	Mars (MWh)	Totali TM1
2016	7,820	8,433	10,180	26,433
2017	4,120	5,181	6,051	15,352
2018	5,480	6,211	7,841	19,532
2019	4,821	5,360	6,240	16,421
2020	6,121	7,180	9,081	22,381
2021	4,580	5,120	6,381	16,081
2022	7,180	8,581	10,480	26,241
2023	6,480	7,821	9,181	23,482
2024	3,820	4,221	4,481	12,522
2025	4,000	4,600	4,125	12,725
<b>2026</b>	<b>9,029</b>	<b>11,454</b>	<b>6,273</b>	<b>26,756</b>

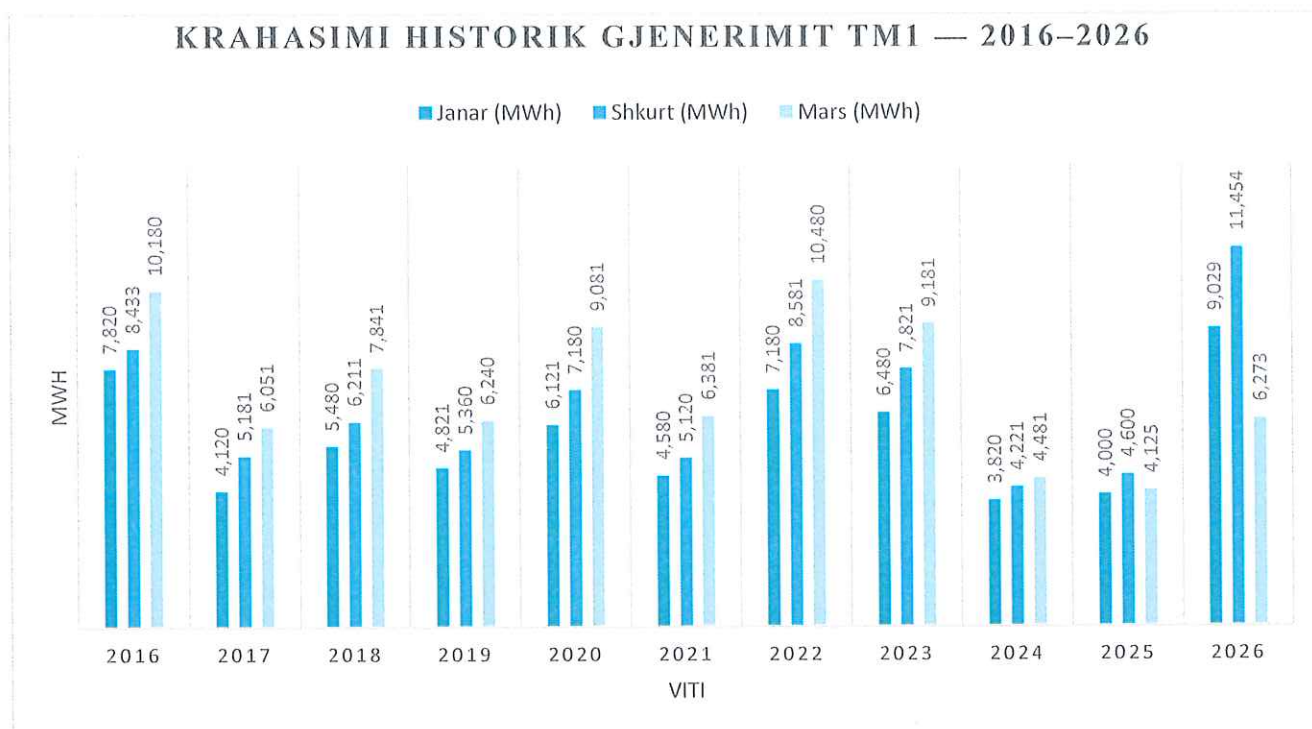


*Krahasimi i gjenerimit me periudhën e njejtë për vitet 2016-2026*

Gjatë TM1 2026, niveli i ujit në liqenin e Ujmanit ka pësuar ndryshime si pasojë e kushteve hidrologjike:

- **Prurjet mesatare:** në Janar prurjet ishin 14.9 m<sup>3</sup>/s, ndërsa në Mars ranë gradualisht në 10.03 m<sup>3</sup>/s.
- **Nivelet:** periudha filloi më 1 Janar me nivelin 684.90 m (297 mil. m<sup>3</sup>) dhe përfundoi më 31 Mars me nivelin 686.55 m (312.9 mil. m<sup>3</sup>).
- **Menaxhimi:** gjatë Shkurtit dhe Marsit është bërë menaxhim intensiv duke balancuar prodhimin me prurjet, duke rezultuar në ulje prej 7.1 milionë m<sup>3</sup> gjatë dy muajve (nga 320 mil. m<sup>3</sup> në 312.9 mil. m<sup>3</sup>)

Në tabelën në vazhdim është paraqitur në mënyrë grafike prurjet mesatare mujore:

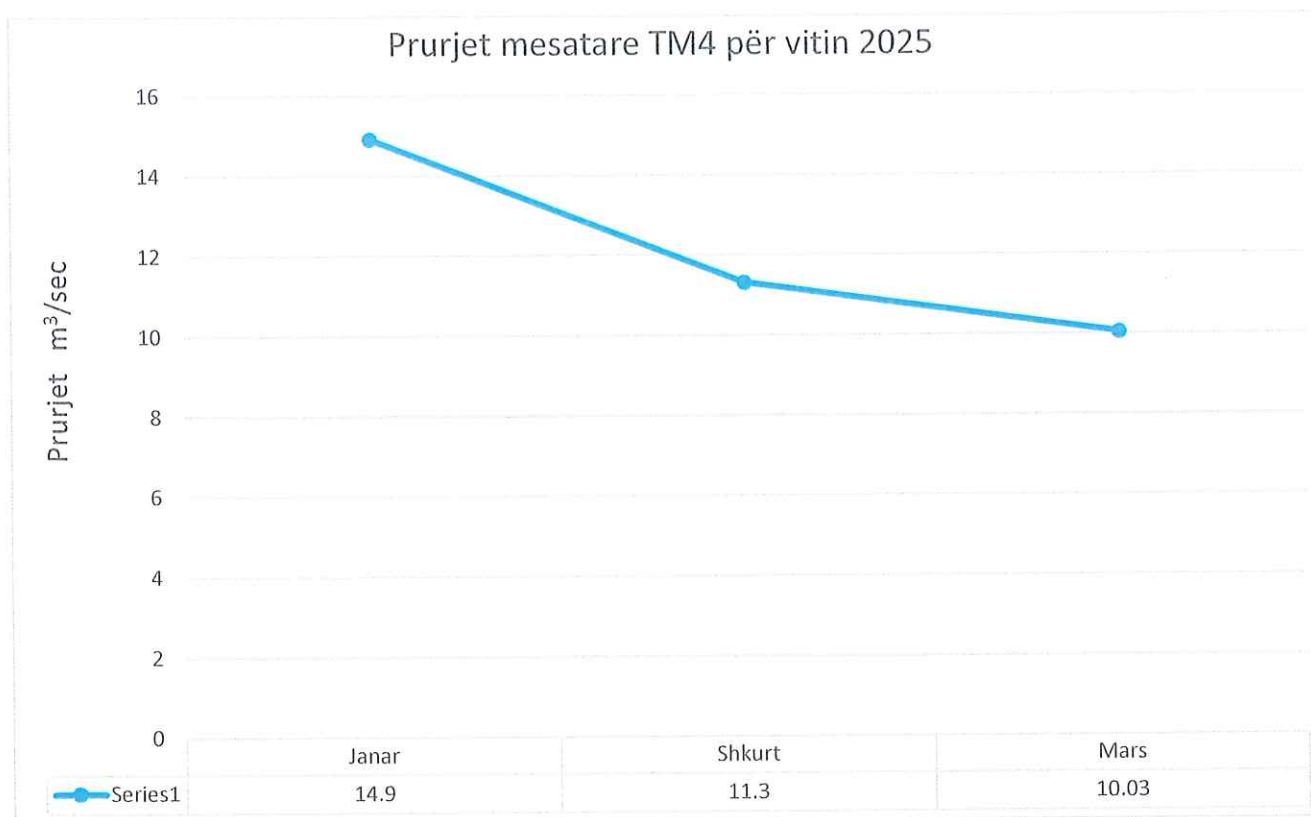


Prurjet mesatare në akumulimin Ujmanit gjatë tremujorit TM1 ishin **12.08 m³/sec**

### Përmbledhja e luhatjeve të nivelit (1 Janar – 31 Mars 2026)

- Fillimi i Janarit (Faza Dimërore e Prurjeve të Larta): më 1 janar, niveli i ujit ka qenë në kuotën 684.90 m, me një vëllim prej 297 mil. m<sup>3</sup>. Prurjet mesatare ishin të ulëta, rreth 14.9 m<sup>3</sup>/s.
- Stabiliteti dhe Rritja Graduale: gjatë muajit janar, niveli ka shënuar rritje të madhe, duke arritur në fund të muajit në kuotën 687.32 m (320 mil. m<sup>3</sup>).
- Piku i Akumulimit (Fillim Shkurtit): pas rritjes intensive gjatë janarit (+23 mil. m<sup>3</sup>), kulmi u arrit në fund të janarit me nivelin 687.32 m, me një vëllim maksimal prej 320 mil. m<sup>3</sup>.
- Faza e Menaxhimit dhe uljes së nivelit: si pasojë e prurjeve në rënie gjatë shkurtit-marsit, prodhimi është optimizuar sipas tregut. Prurjet gjatë shkurtit-marsit, prodhimi u optimizua me çmimet ALPEX; ulja neto ishte vetëm 7.1 milionë m<sup>3</sup>.
- Mbyllja e Vitit: bilanci i TM1 është pozitiv me rritje neto +1.65m. Niveli ka arritur 7.1 milionë m<sup>3</sup> brenda TM1. Bilanci tremujor pozitiv +1.65m. Më 31 mars, niveli ka përfunduar në kuotën 686.55 m (312.9 mil. m<sup>3</sup>).

	Vëllimi 10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup>	Prurjet m <sup>3</sup> /sec
Janar	320	14.9
Shkurt	315	11.3
Mars	313	10.03

KRAHASIMI HISTORIK PRURJEVE TM1 (m <sup>3</sup> /sec)   2016–2026											
Muaji	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Janar	14.90	16.60	12.20	32.10	8.40	23.88	5.30	5.60	8.00	4.50	7.10
Shkurt	11.30	9.40	9.40	18.50	12.70	39.19	10.90	20.03	21.10	18.20	16.90
Mars	10.03	13.90	12.50	23.10	13.30	20.92	21.80	22.14	36.30	25.20	31.80
MESATARJA	12.08	13.30	11.37	24.57	11.47	28.00	12.67	15.92	21.80	15.97	18.60

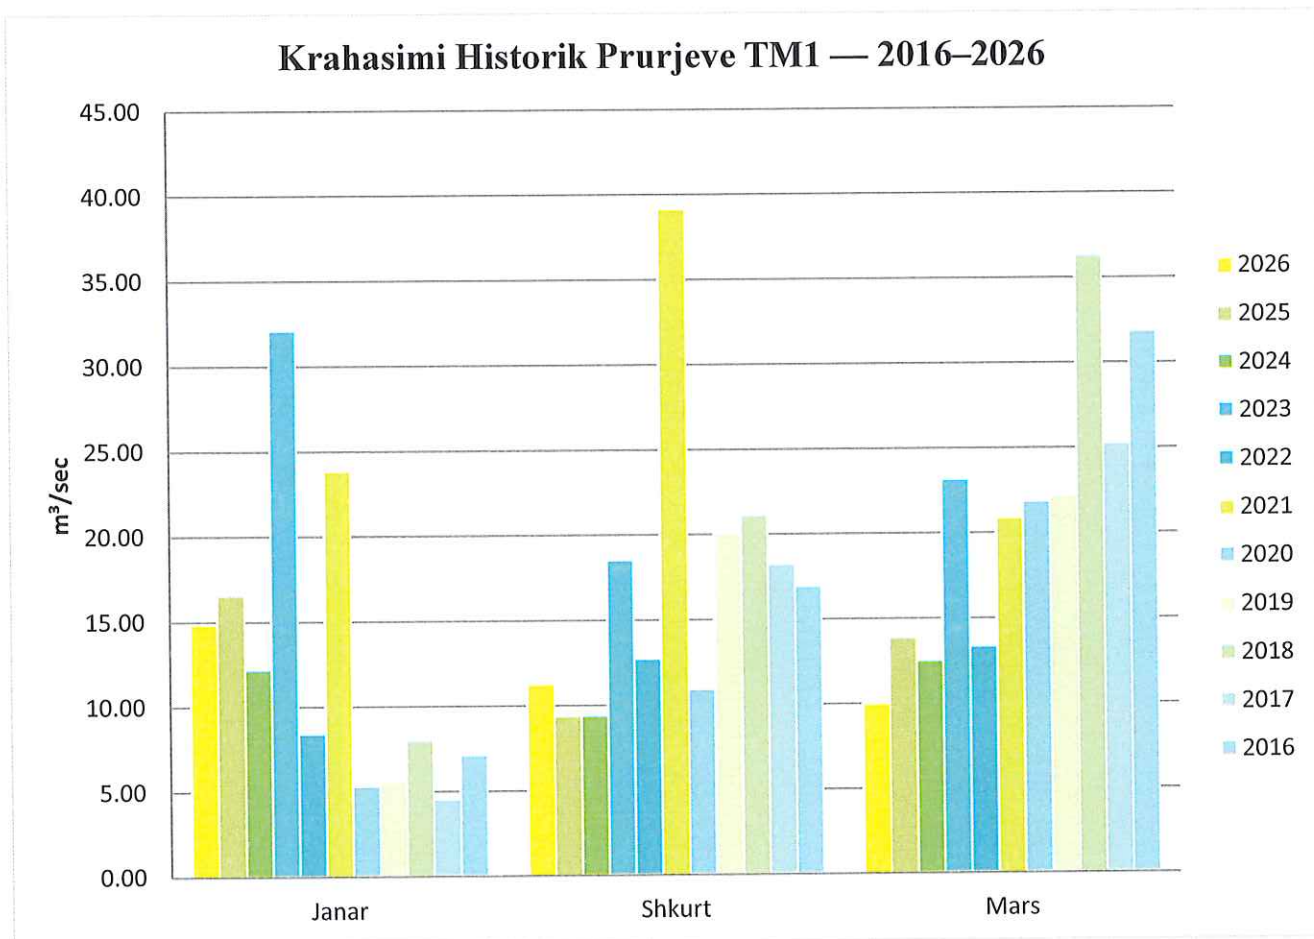

## Analiza e Trendit sipas Viteve

### TM1 2023: Stabilitet dhe Prurje të Mëdha

TM1 2023 regjistroi prurjet më të larta të dekadës: Janar=32.1, Shkurt=18.5, Mars=23.1 m<sup>3</sup>/s. Gjenerimi arriti nivele të larta dhe rezervat siguruan fillim solid. Si referim, mesatarja ishte rreth **rreth 26 m<sup>3</sup>/s** ) mbajtën nivelin mbi kuotën 684 m. Kjo siguroi një rezervë solide për fillimin e vitit 2024.

### TM1 2024: Prurje të Ulëta dhe Sfida Operacionale

Ky ishte viti më kritik i analizuar.

- **Prurjet e ulëta:** nga fundi i vitit 2023 në fundin e vitit 2024, liqeni humbi rreth **47 milionë** ujë.
- **Arsyet:** gjenerimi: TM1 2024 prodhoi ~12,000 MWh. Bilanci hidrologjik mbeti stabil duke filluar sezonin me rezerva adekuate. Prurjet mesatare TM1 2024 ishin nën **10 m<sup>3</sup>/s mesatarisht** ) dhe temperaturat e larta që rritën avullimin.
- **Niveli Kritik:** kuota prej **678.46 m** ishte shumë pranë niveleve që kërkojnë kufizime strikte të shfrytëzimit.


### TM1 2026: Tejkallim Rekord i Planit - +34% mbi Objektivin

Ky vit shënoi një kthesë pozitive, duke rikthyer liqenin në parametra optimalë.

- **Luhatja brenda TM1:** liqeni nisi gjatë janarit me (1 Jan: 684.90m, 297 mil.m<sup>3</sup> vs TM1 2025: 678.46m, 243 mil.m<sup>3</sup> — diferenca +54 mil.m<sup>3</sup>) **297 mil. m<sup>3</sup>** dhe arriti kulmin në fund të janarit me **320 mil. m<sup>3</sup>**.
- **Performanca e Shkëlqyer:** TM1 2026 tejkaloj planin me 34%. Krahasuar me TM1 2025 (11,724 MWh), prodhimi u rrit 128%. Prurjet 2026 (Janar=14.9, Shkurt=11.3, Mars=10.03 m<sup>3</sup>/s) janë nën ato të 2025 (Jan=16.6, Feb=9.4, Mar=13.9) por menaxhimi optimal i çmimeve ALPEX siguroi tejkallim të planit. Diferencë prej **7.1 milionë m<sup>3</sup>** gjatë TM1 shkurt-mars (nga 320 në 312.9 mil. ). Ky nuk ishte deficit, por **menaxhim i hapësirës absorbuese** për të parandaluar tejmbushjen nga prurjet rapide prej **10.03 m<sup>3</sup>/s gjatë marsit** .


Niveli i ujit në liqe me 1 Janar ka qenë në kuotën 684.90 m (297 mil. m<sup>3</sup>, shkalla 55.5) dhe më 31 Mars niveli ka qenë në kuotën 686.55 m (312.9 mil. m<sup>3</sup>, shkalla 47)

### Lartësia Mbidetare e Liqenit Ujëman — TM1 2026 (m a.s.l.)

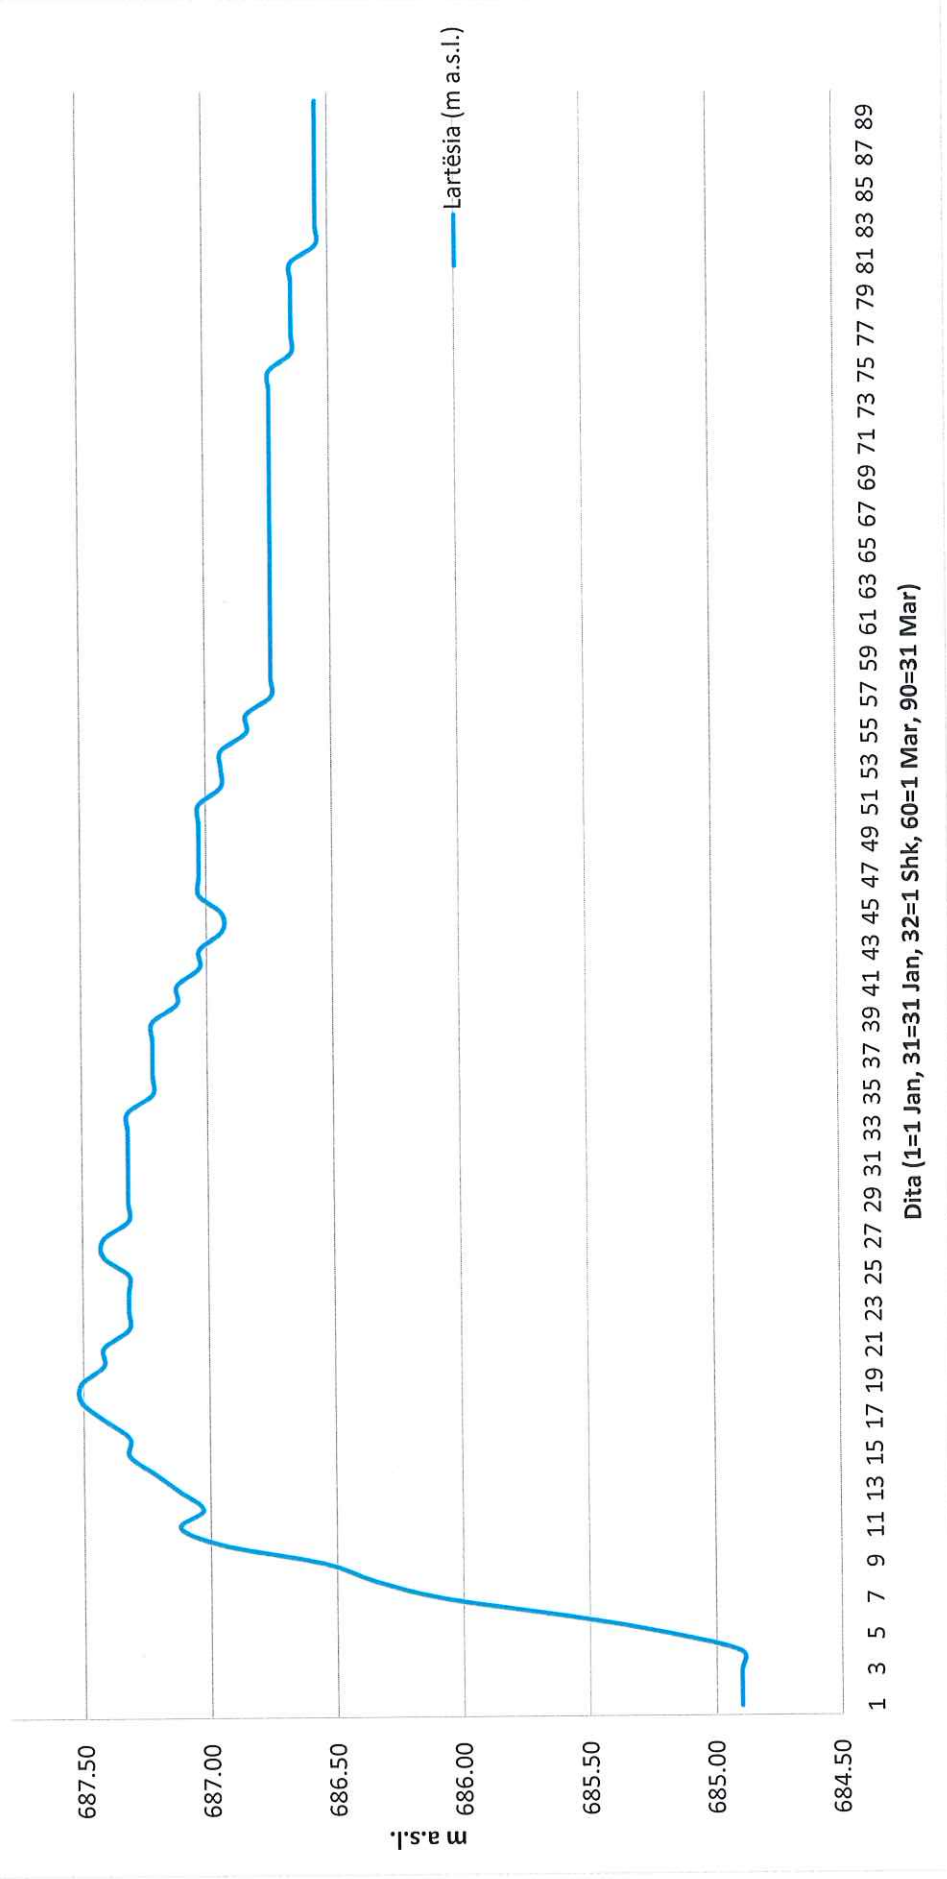

Dita (1=1 Jan, 31=31 Jan, 32=1 Shk, 60=1 Mar, 90=31 Mar)

Lartësia Mbidetare e Liqenit Ujëman — TM1 (Janar–Mars) | 2013–2026

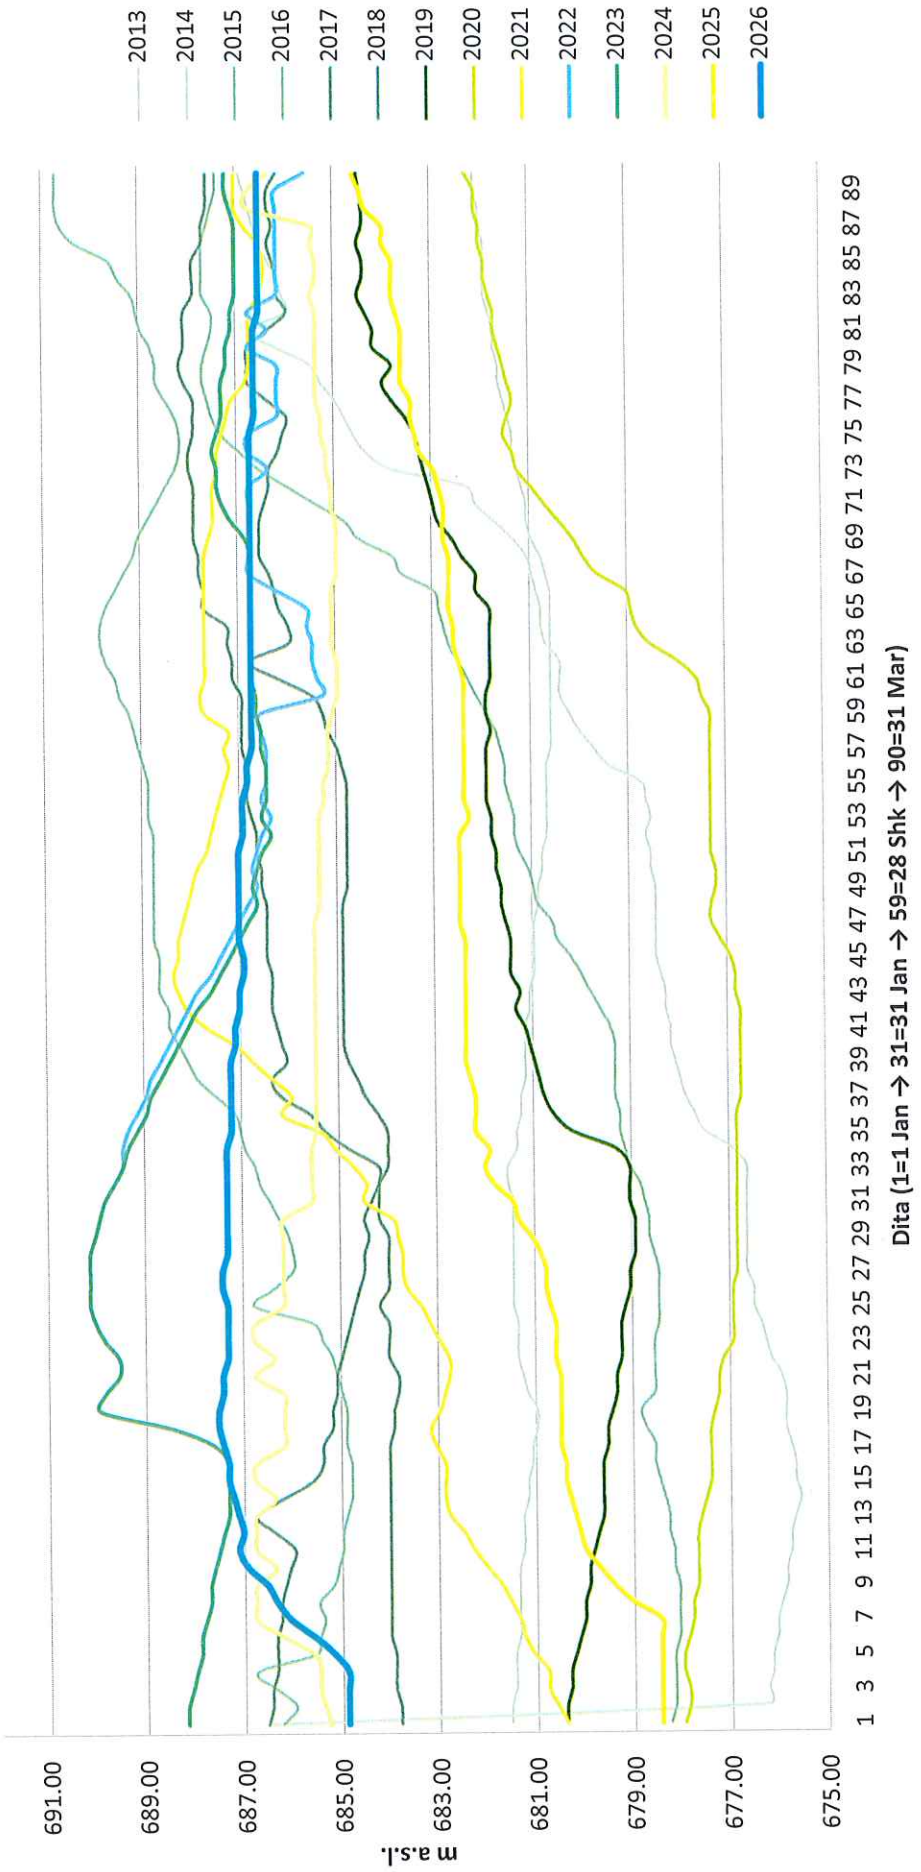

## 2.2. Departamenti "Ujitja"

Departamenti "Ujitja" gjatë periudhës Janar-Mars (TM1) 2026, së bashku me tri Njësitë Punuese Vushtrri, Shkabaj dhe Komoran, ka vazhduar me aktivitetet e punës që dalin konform detyrave të punës gjatë tremujorit të parë, pra gjatë muajve Janar, Shkurt dhe Mars të vitit 2026. Puna e Departamentit "Ujitja" gjatë TM1 ka përfshirë këto veprime si në vijim: kontrollimin e infrastrukturës së ujitjes, mirëmbajtjen e Stacioneve Pompikë, përfshirë këtu, mirëmbajtjen makinerike dhe elektrike përgatitjen e sistemit të ujitjes për fillimin e sezonit të ri të ujitjes, regjistrimin e aseteve të ndërmarrjes, evakuimin e ujërave gjatë reshjeve të muajit Janar, takimet me Drejtorët e Drejtorive të Bujqësisë nëpër Komuna si dhe vizitat në terren me Ekspertët e SCP-së, etj.

Janar- punëtorët në terren kanë vazhduar me vëzhgimin rutinor të infrastrukturës së ujitjes, për të siguruar që sistemi të jetë i mbrojtur nga ndërhyrjet e ndryshme keqbërëse. Këto kontrole kanë përfshirë inspektimin e pjesëve fazonerike, pusetat, hidrantat dhe përcjelljen e gjendjes, nëse afër apo mbi gypa të ujitjes po ndërtohen objekte të ndryshme. Punonjësit e Departamentit "Ujitja" në tri Njësitë Punuese, kanë vazhduar me mirëmbajtjen e rregullt elektro-makinerike nëpër të gjitha Stacionet Pompikë. Kontrolli rutinor i prezencës së punëtorëve nëpër Stacione Pompikë është bërë për të siguruar që punonjësit janë në vendin e tyre të punës dhe se po kryejnë detyrat e tyre me efikasitet dhe saktësi. Më vendim në tri Njësitë Punuese janë formuar komisionet për regjistrimin e aseteve të ndërmarrjes dhe gjatë muajit Janar është përfunduar regjistrimi i aseteve. Këto komisione, në koordinim me Zyrën e Financave, gjatë muajit Janar 2026 kanë përfunduar regjistrimin e aseteve në të tri Njësitë Punuese. Ky është një proces i rëndësishëm për të siguruar që të gjitha asetet janë të dokumentuara dhe në rregull. Rreshjet e mëdha të shiut që rënë në pjesën e parë të muajit Janar 2026, shkaktuan shumë vërshime. Departamenti i Ujitjes së bashku me udhëheqësit e tri Njësisë Punuese dhe me punëtorët e terrenit, kanë organizuar vizita në terren dhe gjatë tërë kohës kanë monitoruar nivelin e ujit në kanalet e hapura dhe janë ndërmarrë shumë veprime në mbrojtjen e kanaleve nga ujërat e vërshimeve. Gjatë kësaj kohe drejtori i ujitjes ka vizituar Njësitë Punuese dhe Stacionet Pompikë duke mbajtur edhe kontakte ditore përmes telefonit me udhëheqësit e Njësisë Punuese duke u informuar rreth nivelit të ujërave në kanalet e hapura për ujitje. Nuk ka pas dëme nga vërshimet.

Shkurt - gjatë muajit shkurt përveç aktiviteteve të përditëshme, vizitave në terren në të gjitha zonat ku shtrihet sistemi i ujitjes dhe kontrollimi i infrastrukturës së ujitjes në përgjithësi, ka patur edhe shumë aktivitete të tjera siç janë:

- Vizita në terren nga ekspertët e SCP-së dhe
- Takimet me Drejtorët e Drejtorive për Bujqësi në komunat: Mitrovicë Vushtrri, Obiliq dhe Prishtinë.

Vizita nga SCP ka filluar më datë 3 Shkur 2026, ku është vizituar Nj.P. në Shkabaj. Me datë 4 Shkurt, së bashku me ekspertët nga SCP, z. Ludovic Loonis, dhe z. Lois Burrle, vizitën e kanë vazhduar në Nj.P. në Vushtrri ku përpos Njësisë Punuese kanë vizituar edhe tri Stacionet Pompikë në Banjskë, Pantinë dhe në Samadrexhë. Me datë 6 Shkurt së bashku me ekspertët

t nga SCP e kemi vizituar Nj.P. në Komoran së bashku më katër Stacionet Pompikë në Gllobar, Korroticë, Gjyrashin dhe Fushticë. Gjatë këtyre vizitave nga ekspertët e SCP-së janë ofruar të gjitha të dhënat e duhura. Gjatë muajit Shkurt në koordinim me udhëheqësit e Njësisë Punuese, kemi vizituar Drejtoret e Drejtorive për Bujqësi, nëpër komunat: Prishtinë Obiliq, Mitrovicë dhe Vushtrri.

Në këto takime, Drejtoret për Bujqësi i kanë informuar për mundësitë dhe kapacitetet e N. H."Ibër-Lepenc" për ujitjen e kulturave bujqësore nëpër komunat e tyre. Janë informuar edhe për ngritjen e çmimit të ujitjes nga 110€/ha, në 140€/ha. Diskutimet kanë qenë në lidhje me mundësinë e nënshkrimit të Memorandumeve të Bashkëpunimit me të cilët komunat do të subvencionojnë çmimin e ujitjes për fermerët. Të gjitha komunat kanë shprehur gadishmëri për nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit.

Mars – që në fillim të muajit Mars 2026, pra më përmirësimin e kushteve meteorologjike, inxhinjerët, teknikët dhe punëtorët e terrenit të tri Njësisë Punuese kanë vazhduar me kontrollimin e rrjetit të ujitjes, duke bërë identifikimi i prishjeve në rrjetin e ujitjes, pastaj është bërë Plani i rehabilitimit të dëmëve ku janë caktuar edhe prioritetet për fillimin e përgatitjes së sistemit për sezonin e ri të ujitjes 2026. Plani i veprimit për përgatitjen e sistemit të ujitjes për fillimin e sezonit të ri të ujitjes është i bazuar edhe në kërkesat e fermerëve, pra në pjesët e hidrosistemit ku fermerët shprehin interesim për ujitjen e tokave bujqësore. Me paraqitjen e kushteve të mira atmosferike të tri Njësit Punuese punët kanë filluar në pastrimin e kanaleve të hapura dhe të gjitha procedurat e duhura. Gjatë muajit Mars drejtori i ujitjes ka pritur në vizitë përfaqësuesit e SCP-së, më të cilët ka vizituar shumë fermer në të tri Njësitë Punuese, poashu ka vizituar edhe disa fermer të komuniteteve tjera pakicë. Nga SCP-ja është angazhuar një kompani për anketimin e fermerve, punëtorët e Njësisë Punues i kanë ndihmuar për organizimin e takimeve më fermer. Në kuadër të këtyre takimeve, me fermerët është diskutuar edhe rreth nevojave të tyre për ujitje dhe i ka informuar fermerët për mundësitë tona të furnizimit me ujë për ujitje dhe përgatitjen e sistemit të ujitjes për sezonin e ri të ujitjes 2026. Drejtori I ujitjes është takuar me të gjithë Drejtoret e Drejtorive Komunale për Bujqësi ku deri tani vetëm Komuna e Obiliqit e ka nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit, jemi në pritje edhe të Komunave të tjera për nënshkrimin e Memorandumit. Këtu duhet theksuar se Komuna e Drenasit nuk ka shprehur vullnet për nënshkrimin e Memorandumit, sipas tyre për mungesë të financave.

## 2.3. Shërbimi i Financave

### Të hyrat

Gjatë tremujorit të parë të vitit TM1 2026 të hyrat e ndërmarrjes janë realizuar në vlerë **3,493,879 €**, ndërsa ishin planifikuar të realizohen në vlerë prej **2,649,623 €** që do të thotë se të hyrat e realizuara janë për **32%** më të larta se të planifikuara dhe për **37%** më të larta se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

- Nga energjia elektrike janë realizuar të hyrat në vlerë prej **2,816,652 €**, ndërsa kanë qenë të planifikuara të realizohen të hyrat në vlerë **2,100,000 €** apo shprehur në përqindje realizimi ishte më i lartë për **34 %** se planifikimi dhe për **39 %** më i lartë se realizimi në periudhën e njëjtë të vitit paraprak.
- Nga shitja e ujit të papërpunuar janë realizuar të hyrat në vlerë prej **503,413 €**, ndërsa të planifikuara ishin **549,623 €**. Realizimi ishte për **8%** më i ultë se planifikimi dhe për **10 %** më i ultë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.
- Të hyrat tjera në vlerë **24,369 €** janë kryesisht të ardhura nga interesi bankar.
- Në vijim janë paraqitur në formë tabelare të hyrat sipas llojit, sasisë dhe vlerës monetare:

**Tabela nr. 1 RAPORTI I BIZNESIT PËR PERIUDHËN TM1 2026**

N.r.	Emërtimi	Nj.mat.	Realizimi TM 1 2025	Plani TM1 2026	Realizimi TM 1 2026	plani	2026
0	1	2	3	4	5	6 (5:4)	7(5:3)
<b>1</b>	<b>PRODIMI</b>						
1.1	Energjia elektrike	Mwh	10,784.23	20,000.00	24,996.50	125	232
1.2	Imbalanca	Mwh	862.52	-	1,587.64		184
1.3	Uji	m <sup>3</sup>	14,672,720.00	14,665,974	13,761,748	94	94
1.4	Ujitja	ha	-	-	-		
<b>2</b>	<b>TË HYRAT</b>		<b>2,556,667</b>	<b>2,649,623</b>	<b>3,493,879</b>	<b>132</b>	<b>137</b>
2.1	Energjia elektrike	€	1,890,579.78	2,100,000	2,816,652	134	149
2.2	Të hyrat nga imbalanca	"	93,108.83		149,444		161
2.3	Uji	"	556,518.21	549,623.37	503,413.39	92	90
2.4	Ujitja	"	-	-	-		
2.5	Të tjera	"	16,460.13	-	24,369.28		148
<b>3</b>	<b>SHPENZIMET</b>		<b>1,198,465.99</b>	<b>1,541,100.09</b>	<b>1,410,629.28</b>	<b>92</b>	<b>118</b>

**Shpenzimet**

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2026 shpenzimet e ndërmarrjes kanë arritur vlerën prej **1,410,629€**, ndërsa ishin planifikuar të shpenzohen **1,540,101€**. Realizimi i shpenzimeve është më i ultë për **8%** në krahasim me planin dhe për **18 %** më i lartë se periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Shpenzimet kryesore të ndërmarrjes gjatë këtij 3 mujori janë në paga dhe medijtje, ndërsa pjesa tjetër e shpenzimeve janë kryesisht taksat e ndryshme për rregullatorë, shpenzimet komunale, pastaj shpenzimet e karburanteve dhe shpenzimet e mirëmbajtjes.

Në vijim janë paraqitur në formë analitike të gjitha shpenzimet e ndodhura gjatë periudhës janar-mars 2026:

**Tabela nr. 2. Raporti analitik i shpenzimeve**

Kodi	Kategoria e shpenzimeve	Realizimi	Plani	Realizimi	Indeksi	Indeksi
		TM1 2025	TM 1 2026	TM1 2026	%	%
		1	2	3	4=(3:2)	5=(3:1)
<b>B.1</b>	<b>Pagat dhe medijtjet</b>	<b>905,946.25</b>	<b>1,018,397.61</b>	<b>995,303.19</b>	<b>98</b>	<b>110</b>
B.1.1	Pagat neto të punëtorëve	648,953.50	714,875.66	699,372.33	98	108
B.1.2	Pagat ndrrimit nates	18,959.23	20,930.00	25,644.45	123	135
B.1.3	Bonuset	2,200.00	0.00	2,345.00		107
B.1.4	Difereca ne paga dhe Paga percjellse	2,897.00	4,305.00	2,332.93	54	81
B.1.5	Shujta	62,968.00	88,989.00	77,495.00	87	123
B.1.6	Tatimi ne paga	55,703.67	65,049.09	63,573.96		114
B.1.7	Kontributet e punemaresit 5%	42,901.50	48,249.43	47,155.27	98	110
B.1.8	Kontributi i ndërmarrjes 5%	42,901.50	48,249.43	47,155.27	98	110
B.1.9	Antersia sindikale	2,481.01	0.00	2,674.02		108
B.1.10	Sigurimi shendetësor	17,112.90	18,885.00	18,687.02	99	109
B.1.11	Pagat e Bordit	8,867.94	8,865.00	8,867.94	100	100
<b>B.2</b>	<b>Shpenzimet e udhëtimëve zyrtare dhe reprezentacionet</b>	<b>2,427.02</b>	<b>10,630.00</b>	<b>13,157.59</b>	<b>124</b>	<b>542</b>
B.2.1	Shpenzimet e udhëtimëve zyrtare	0.00	7,150.00	4,122.78	58	
B.2.2	Shpenzimet e reprezentacionit	2,427.02	3,480.00	9,034.81	260	372
<b>B.3</b>	<b>Shpenzimet e marketingut</b>	<b>0.00</b>	<b>2,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
B.3.1	Shpenzimet e marketingut	0.00	2,650.00	0.00	0	
<b>B.4</b>	<b>Shpenzimet e mirëmbajtjes</b>	<b>6,342.43</b>	<b>18,222.97</b>	<b>18,196.41</b>	<b>100</b>	<b>287</b>
B.4.1	Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve	4,723.07	3,896.97	2,933.40	75	62
B.4.2	Mirëmb.e objekteve dhe paisjeve	0.00	950.00	3,151.46	332	
B.4.3	Mirëmbajtja infrastrukturore	0.00	0.00	0.00		
B.4.4	Mirëmbajtja tekniko-informative	1,253.21	8,376.00	4,994.90	60	399

B.4.5	Servisimi dhe mbushja e aparatave kundër zjarrit AKZ	366.15	5,000.00	7,116.65	142	1944
<b>B.5</b>	<b>Shpenzimet komunale</b>	<b>60,772.17</b>	<b>104,613.09</b>	<b>48,099.05</b>	<b>46</b>	<b>79</b>
B.5.1	Shpenzimet e ujit	135.33	397.00	495.63	125	366
B.5.2	Shpenzimet për mbeturina	687.39	663.00	522.22	79	76
B.5.3	Energjia Elektrike	58,079.28	100,553.09	47,081.20	47	81
B.5.4	Shpenzimet e ngrohjes (Termokos)	1,870.17	3,000.00	0.00	0	0
<b>B.6</b>	<b>Material harxhues</b>	<b>3,649.99</b>	<b>56,260.00</b>	<b>3,806.25</b>	<b>7</b>	<b>104</b>
B.6.1	Artikuj me vlerë të vogël	3,409.69	3,450.00	3,507.98	102	103
B.6.2	MHT-mbrojtja higjeno-teknike	0.00	36,500.00	13.50	0	
B.6.3	Material elektrik	187.64	420.00	80.32	19	43
B.6.4	Material higjenik	52.66	8,740.00	111.18	1	211
B.6.5	Material për zyre	0.00	7,150.00	93.27	1	
<b>B.7</b>	<b>Material për ndërrimin dhe riparimin e gypave në rrjetin e ujitjes</b>	<b>552.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>20.00</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
B.7.1	Material për ndërrimin dhe riparimin e gypave në rrjetin e ujitjes	552.00	1,000.00	20.00	2	4
<b>B.8</b>	<b>Shpenzimet për shërbime</b>	<b>2,842.99</b>	<b>34,375.00</b>	<b>3,804.80</b>	<b>11</b>	<b>134</b>
B.8.1	Trajnime	2,652.00	13,505.00	3,637.00	27	137
B.8.2	Shpenzime të shtypjes	190.99	870.00	167.80	19	88
B.8.3	Shpenzime projektuese	0.00	0.00	0.00		
B.8.4	Shpen.shërbimeve ligjore	0.00	20,000.00	0.00	0	
<b>B.9</b>	<b>Shpenzime tjera</b>	<b>54,204.08</b>	<b>41,870.00</b>	<b>21,122.31</b>	<b>50</b>	<b>39</b>
B.9.1	Shpenzime tjera	52,582.21	39,200.00	20,160.44	51	38
B.9.2	Parkingu për automjete	756.87	1,650.00	756.87	46	100
B.9.3	Autolarja	325.00	720.00	205.00	28	63
B.9.4	Çregjistrimet	0.00	0.00	0.00		
B.9.5	Konkurset	540.00	300.00	0.00	0	0
<b>B.12</b>	<b>Shpenzimet e telekomunikimit</b>	<b>6,173.97</b>	<b>8,109.00</b>	<b>6,386.36</b>	<b>79</b>	<b>103</b>
B.12.1	Telefonia fikse	120.86	357.00	217.60	61	180
B.12.2	Telefonia mobile	1,651.24	1,908.00	1,851.65	97	112
B.12.3	Kablloviku	243.90	84.00	100.22	119	41
B.12.4	Interneti	4,139.25	5,700.00	4,200.75	74	101
B.12.5	Shpenzimet postare	18.72	60.00	16.14	27	86
<b>B.13</b>	<b>Derivatet</b>	<b>6,463.65</b>	<b>6,855.21</b>	<b>9,846.58</b>	<b>144</b>	<b>152</b>
B.13.1	Nafta	6,179.09	5,973.29	9,092.95	152	147
B.13.2	Benzina	0.00		0.00	#DIV/0!	
B.13.3	Vajrat	284.56	881.92	753.63	85	265
<b>B.14</b>	<b>Detyrime kontigjente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
B.14.1	Detyrime kontigjente	0.00	0.00	0.00		
<b>B.15</b>	<b>Provizionet dhe taksat</b>	<b>148,153.94</b>	<b>227,618.00</b>	<b>290,891.78</b>	<b>128</b>	<b>196</b>
B.15.1	Tatimi ne pronë	0.00	0.00	0.00		
B.15.2	Taksa për rregullatorë	65,478.95	140,672.00	184,509.67	131	282
B.15.2.1	Taksa për MMPH	78,877.17	81,831.00	101,675.91	124	129
B.15.3	Provizioni bankar	1,201.94	0.00	1,418.38		118
B.15.4	Sigurimi i automjeteve	1,842.24	3,336.00	1,927.42	58	105

B.15.5	Regjistrimi i automjeteve	753.64	1,779.00	1,360.40	76	181
B.15.6	Interesi i kredisë BB	0.00	0.00	0.00		
B.15.7	Tatimi në fitim	0.00	0.00	0.00		
<b>B.16</b>	<b>Kompenzimi i dëmëve</b>	<b>937.50</b>	<b>10,500.00</b>	<b>-5.04</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
B.16.1	Kompenzimi i dëmëve	937.50	10,500.00	-5.04	0	-1
<b>B.17</b>	<b>Shpenzimet nga imbalanca</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
B.17.1	Shpenzimet nga imbalanca	0.00	0.00	0.00		
	<b>Total</b>	<b>1,198,465.99</b>	<b>1,540,100.88</b>	<b>1,410,629.28</b>	<b>92</b>	<b>118</b>

### Rezultati financiar

Gjatë këtij tremujori ndërmarrja ka pasur rezultat pozitiv financiar në vlerë prej 752,669 €. Në vijim mund të shihet pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve.

**Tabela 3. Pasqyra e të ardhurave TM1 2026**

Pasqyra e të ardhurave dhe Shpenzimeve	TM1 2026 (€)	TM1 2025 (€)
Të Hyrat nga shitja energjisë elektrike	2,816,652	1,890,580
Të Hyrat nga jobalanca pozitive	149,444	93,109
Të Hyrat nga shitja e ujit me shumicë	503,413.39	556,518
Të Hyrat nga ujitja	-	-
Të Ardhurat tjera	24,369.28	16,460
<b>Total të hyrat dhe të ardhurat bruto</b>	<b>3,493,879</b>	<b>2,556,667</b>
Pagat dhe meditet	995,303	905,946
Shpenzimet për udhëtime zyrtare	4,123	0.00
Reprezentacioni	9,035	2,427
Shpenzimet e marketingut	0.00	0.00
Shpenzimet e mirëmbajtjes	18,196	6,342
Shpenzimet komunale	48,099	60,772
Material hargjues	3,806	3,650
Material për rrjetin e ujitjes	20	552.00
Shpenzime për shërbime	3,805	2,843
Shpenzime tjera	21,122	54,204
Shpenzimet telekomunikuese	6,386	6,174
Derivatet	9,84	6,464
Kompensimi dhe taksat	0.00	0.00
Kompensimi i dëmëve	290,89	148,154
Shpenzimet nga imbalanca	-5.04	938
<b>Totali i shpenzimeve</b>	<b>1,410,629</b>	<b>1,198,466</b>
<b>Fitimi/humbja operative</b>	<b>2,083,250</b>	<b>1,358,201</b>
<b>Total zhvlerësimi</b>	<b>1,193,127</b>	<b>1,151,203.33</b>
<b>Total fitimi (humbja) neto</b>	<b>890,123</b>	<b>206,998</b>

## 2.4. Zyra e Prokurimit

Gjatë tremujorit të parë 2026 (TM1 2026), Departamenti i Prokurimit ka zhvilluar këto aktivitete:

#	Nr prok	Titulli	Data e inicimit	Procedura dhe vlera e parashikuar	Data e hapjes	Nënshkrimko ntrate	Vlera e kontratës	Kompania fituese	Komente
01	25-044	Furnizim me mjete mbrojtëse në punë – RITENDER 3	19.11.2025	25,000.00 €	12.12.2025	/	/	/	Anulluar, asnjë ofertë e përgjegjshme!
02	25_080	Furnizim me makineri për pastrimin e kanaleve dhe vegjetacionit - Ritender	10.12.2025	60,000.00 €	05.01.2026	15.01.2026	57,160.38 €	OE: Profitech SH.P.K.	KONTRAKTUAR!
04	26_001	Meremetimi i kthinës së pulstistit operatorit në SP Bivolak	19.01.2026	990.00 €	22.01.2026	/	/	/	Anulluar, asnjë ofertë e pranuar!
01	25_087	Mirëmbajtje të Licencave NAV, mirëmbajtje dhe zhvillime në sistemin ekzistues ERP-BC 14	16.12.2025	25,000.00 €	16.01.2025	18.02.2026	24,850.80 €	GOE: ASSECO SEE SH.P.K.; Business Solution	KONTRAKTUAR!
02	26_002	Mirembajtja vjetore e SP've dhe ON've (pjesa elektrike, makinerike dhe hidraulike)	19.01.2026	17,000.00 €	13.02.2026	/	/	/	Anulluar, asnjë ofertë e përgjegjshme!
04	26_004	Furnizim dhe montim i pjesëve për veturën AUDI A8	23.01.2026	980.00 €	27.01.2026	03.02.2025	961.70 €	OE: Bastri Ademi B.I	KONTRAKTUAR!
01	26_002	Mirembajtja vjetore e SP've dhe ON've (pjesa elektrike, makinerike dhe hidraulike)	19.01.2026	17,000.00 €	13.02.2026	/	/	/	Anulluar, asnjë ofertë e përgjegjshme!
02	26_003	Aneks Kontrate për punë shtesë – Renovimi i objektit të IL 'se	03.02.2026	64,948.52 €	26.02.2026	05.03.2026	64,948.52 €	GOE: BABAJ COMPAN Y SH.P.K. & IBM SH.P.K.	KONTRAKTUAR!
03	26_006	Rehabilitimi i transformatoreve energjetik 35 6kV: (4000 kVA)	23.01.2026	30,000.00 €	20.02.2026	06.03.2026	29,854.00 €	GOE: RISAMONT SH.P.K. & Valdet Tatari B.I.	KONTRAKTUAR!
04	26_005	Bateri stacionare në SP Besi dhe SP Bivolak	26.01.2026	20,000.00 €	20.02.2026	12.03.2026	14,648.52 €	OE: RATA SOLAR SH.P.K.	KONTRAKTUAR!
05	26_007	Furnizim me material operativ (thase dhe material tjetër)	26.01.2026	5,000.00 €	04.02.2026	03.03.2026	3,680.42 €	OE: HPI SH.P.K.	KONTRAKTUAR!

Ndërmarrja Hidroekonomike "Ibër - Lepenc" Sh.A.

06	26_008	Rehabilitimi Elektro - makinerik të 4 stacioneve Pompikë në Nj.P Komoran	27.01.2025	25,000.00 €	20.02.2026	/	/	/	Anulluar, asnjë ofertë e përgjegjshme!
07	26_009	Furnizim me material higjienik	26.01.2026	8,740.00 €	05.02.2026	/	/	/	KONTRAKTUAR!
08	26_010	Montimi dhe servisi i klimave të përdorura	26.01.2026	9,500.00 €	06.02.2026	/	/	/	KONTRAKTUAR!
09	26_011	Blerja e licensave për programe profesionale (AutoCad Civil 3D)	04.02.2026	24,000.00 €	26.02.2026	/	/	/	KONTRAKTUAR!
10	26_012	Furnizim me Lidhëse Riparuese (shellne) dhe Vegla Pune	03.02.2026	85,000.00 €	06.03.2026	/	/	/	Në proces vlerësimi!
11	26_013	Furnizim me gypa dhe fazoneri	04.02.2026	450,000.00 €	18.03.2026	/	/	/	Anulluar, oferte e pranuar ishte mbi çmimin e parashikuar!
12	26_014	Blerja e licencave për programe profesionale AutoCAD	02.02.2026	8,000.00 €	11.02.2026	/	/	/	KONTRAKTUAR!
13	26_015	Riparimi i sistemit Hidraulik në SP Bivolak	18.02.2026	2,700.00 €	27.02.2026	12.03.2026	2,640.00 €	OE: Gazmend Bojku B.I	KONTRAKTUAR!
14	26_016	Ndërrimi i tabelave komanduese në SP Samadregje	16.02.2026	25,000.00 €	11.03.2026	27.03.2026	23,718.00 €	GOE: INLINE ENGINEE RING SH.P.K.; Elektro SP SH.P.K	KONTRAKTUAR!
15	26_017	Shërbime përkthimi për nevojat e Ndërmarrjes	18.02.2026	30,000.00 €	12.03.2026	27.03.2026	0.02 €/cent Deri në 30,000.00	OE: N.SH. PRESTIG E	KONTRAKTUAR!
16	26_018	Testimi i vajit për tre tansformatoret energjetik	23.02.2026	4,000.00 €	03.03.2026	19.03.2026	3,492.80 €	OE: P.P.S- M	KONTRAKTUAR!
17	26_019	Rehabilitimi i pompave në SP Samadregje	16.02.2026	10,000.00 €	12.03.2026	/	/	/	Në proces vlerësimi!
18	26_022	Furnizim me material teknik për puntorinë elektrike dhe mekanike në Shkabaj	24.02.2026	12,000.00 €	18.03.2026	/	/	/	Në proces vlerësimi!
		Furnizimi dhe montimi me pompe të ujit për Skip Hidromek 102B dhe bateri për							Anulluar, asnjë ofertë e pranuar!

Ndërmarrja Hidroekonomike "Ibër - Lepenc" Sh.A.

19	26-023	kamionetën Renault Master.	02.03.2026	03.03.2026	650.00 €	/	/	/	
20	26-025	Furnizim me pajisje të rrjetave (router dhe switch) profesional për siguri kibernetike dhe komunikim.	05.03.2026	17,000.00 €	26.03.2026	/	/	/	Në proces vlerësimi!
21	26-026	Blerja e mjeteve specifike të punës për DPZH	05.03.2026	2,000.00 €	12.03.2026	/	/	/	Në proces vlerësimi!
22	26-002	Mirëmbajtja vjetore e SP've dhe ON've (pjesa elektrike, makinerike dhe hidraulike) – RITENDER.	09.03.2026	17,000.00 €	31.03.2026	/	/	/	Në proces vlerësimi!
23	26-024	Furnizim me vajra dhe yndyrna për SP dhe ON	10.03.2026	5,000.00 €	17.03.2026	/	/	/	<b>Konfirmuar, asnjë oferte e pranuar!</b>
24	26-008	Rehabilitimi Elektro - makinerike i 4 stacioneve Pompikë në Nj.P. Komoran - RITENDER	09.03.2026	25,000.00 €	31.03.2026	/	/	/	Në proces vlerësimi!
25	26-028	Furnizim me mjete mbrojtëse në punë	12.03.2026	35,000.00 €	04.04.2026	/	/	/	Në proces!
26	26-021	Furnizim me vaj të turbinës dhe transformatorit për HC	16.03.2026	10,000.00	08.04.2026	/	/	/	Në proces!
27	26-030	Furnizim me material zyrtar	13.03.2026	7,150.00 €	24.03.2026	/	/	/	Në proces vlerësimi!
28	26-029	Funksionalizimi i zyrave të Njësisë për Mirëmbajtjen e Digave dhe Infrastrukturës	19.03.2026	10,000.00€	10.04.2026	/	/	/	Në proces!
29	26-032	Furnizimi, instalimi dhe lidhja e agregateve dizel	24.03.2026	4,000.0 €	03.04.2026	/	/	/	Në proces!
30	26-024	Furnizim me vajra dhe yndyrna për SP dhe ON - Retender	25.03.2026	5,000.00 €	02.04.2026	/	/	/	Në proces!

## 2.5. Departamenti i Shërbimeve të Përbashkëta

Gjatë tremujorit të **parë të vitit 2026-TM1**, Departamenti i Shërbimeve të Përbashkëta ka realizuar një volum të konsiderueshëm aktivitete në funksion të mbështetjes administrative, ligjore dhe operacionale të ndërmarrjes. Aktivitetet janë zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme dhe të koordinuar, duke siguruar funksionim të rregullt të proceseve të brendshme dhe përmbushje të obligimeve institucionale dhe ligjore.

Në fushën e burimeve njerëzore janë menaxhuar procese të shumta administrative që lidhen me marrëdhëniet e punës, përfshirë lëshimin e vërtetimeve, vendimeve për pushime vjetore dhe pa pagesë, si dhe administrimin e pushimeve mjekësore. Kanë bërë regjistrimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha të dhënave të pushimeve në sistemin elektronik të menaxhimit të stafit. Janë trajtuar kërkesat për trajnime, është përgatitur raporti për sigurimin shëndetësor të punëtorëve dhe familjarëve të tyre, si dhe është realizuar përzgjedhja e punëtorit të dalluar për vitin 2025.

Në kuadër të proceseve të rekrutimit, është menaxhuar konkursi për punëtorët sezonal 2026, përfshirë shpalljen publike, administrimin e aplikimeve, vlerësimin e kandidatëve dhe vendimmarrjen për fazat përkatëse të procesit. Procesi i rekrutimit për pozitën "Operues në Stacione Pompikë" është përgatitur, duke përfshirë testimin me shkrim, intervistat, përgatitjen e procesverbaleve dhe finalizimin e vendimit për pranimin në punë të kandidatëve më të suksesshëm.

Në aspektin juridik, gjatë kësaj periudhe janë menaxhuar disa çështje gjyqësore në fusha të ndryshme si konteste pune, kompensim dëmi dhe lirim prone. Lëndët kanë qenë në faza të ndryshme procedurale, duke përfshirë pranimin e padive, dorëzimin e përgjigjeve në padi, mbajtjen e seancave gjyqësore dhe paraqitjen e qëndrimeve të palëve. Në disa raste janë administruar ekspertiza dhe janë bërë kundërshtime ligjore nga ana e ndërmarrjes, ndërsa në disa çështje seancat janë shtyrë ose janë caktuar data të reja për shqyrtim të mëtejshëm. Në këtë departament kanë pranuar edhe një aktgjykim në favor të ndërmarrjes në një nga rastet e trajtuara. Paralelisht, janë përgatitur dhe dorëzuar dokumente të shumta për nevoja të auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), përfshirë kontrata pune, vendime për ngritje pagash, raporte vijueshmërie, lista të stafit të sistemuar dhe të pasistematizuar, dosje të plota të proceseve të rekrutimit për disa punëtor. Janë përgatitur edhe mostra dhe dokumentacione shtesë sipas kërkesave të auditorëve të jashtëm.

Spektori i IT-së ka siguruar funksionim të qëndrueshëm të sistemeve dhe ka realizuar aktivitete të përditshme dhe javore në drejtim të mirëmbajtjes së infrastrukturës teknologjike. Janë kryer përditësime të sistemeve, monitorim i vazhdueshëm i sigurisë, si dhe masa parandaluese për mbrojtjen nga rreziqet kibernetike. Drejtori i kësaj drejtorie ka ofruar mbështetje teknike për stafin dhe janë zhvilluar përmirësime në sistemet digjitale të menaxhimit të të dhënave, me fokus të veçantë në rritjen e efikasitetit dhe sigurisë së informacionit.

Shërbimi i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë ka vazhduar monitorimet e rregullta në njësitë punuese, duke siguruar zbatimin e standardeve të sigurisë dhe funksionimin e pajisjeve mbrojtëse, pa evidentim të parregullsive të theksuara gjatë kësaj periudhe.

### **Përmbledhje**

Gjatë TM1 2026, Departamenti i Shërbimeve të Përbashkëta ka treguar performancë të lartë në menaxhimin e proceseve administrative, ligjore dhe operative. Aktivitetet kanë qenë të shumta dhe të ndërlydhura, me fokus në përmirësimin e efikasitetit institucional, forcimin e kontrollit të brendshëm, menaxhimin e suksesshëm të proceseve të rekrutimit dhe trajtimin aktiv të çështjeve gjyqësore dhe

kërkesave të auditimit. Departamenti ka kontribuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në stabilitetin dhe funksionimin e përgjithshëm të ndërmarrjes.

## 2.6. Departamenti Planifikim dhe Zhvillim

Në këtë departament gjatë tremujorit të parë TMI- 2026 janë realizuar këto aktivitete:

Nga arkiva kanë pranuar këto dokumente si në vijim:

- Kërkesë për iniciimin e procedurës së prokurimit për projektin me titull: "Blerja e licensave për programe profesionale (AutoCad Civil 3D) me nr. 07-315 të datës: 03.02.2026
- Kërkesë për iniciimin e procedurës së prokurimit për projektin me titull: "Blerja e licensave për programe profesionale (AutoCad) me nr.07-304 të datës: 02.02.2026
- Vendim mbi lejimin e punëve shtesë për kontratën me titull "Renovimi i objektit të drejtorisë – Ritender" me nr 02-316 të datës 03.02.2026.
- Kërkesë për iniciimin e procedurës së prokurimit për projektin me titull: "Blerja e mjeteve specifike të punës për DPZH" me nr. 07-604 të datës: 04.03.2026
- Vendim për komisionin e vlerësimit të tenderit për kontratën me titull "Blerja e mjeteve specifike të punës për DPZH" me nr.02-749 të datës: 17.03.2026
- Vendim për formimin e komisionit për kontratën me titull "Montimi dhe servisimi i klimave të përdorura" me nr 02-673 të datës 11.03.2026.
- Vendim për formimin e komisionit për kontratën me titull "Blerja e licensave për programe profesionale AutoCAD" me nr 02-891 të datës 27.03.2026.
- Vendim për formimin e komisionit për kontratën me titull "Blerja e licensave për programe profesionale (AutoCad Civil 3D)" me nr 02-892 të datës 27.03.2026.
- **Komision mbikëqyrës** - me vendim nr. 02-3067 dt.31.07.2025, është caktuar komisioni mbikëqyrës për menaxhimin e kontratës: "**Renovimi i objektit të Drejtorisë – RITENDER**", me nr. të prokurimit IL-25-4484-5-1-1, Nr. Protokoli 02-3050 i datës 30.07.2025. Menaxheri i projektit dhe OE ka nënshkruar PMK . Më dt. 04.09.2025 menaxheri i projektit ka dërguar Letrën për fillimin e punëve, me çrast OE ka filluar punët nga dt. 05.09.2025. Komisioni mbikëqyrës ka aprovuar punët sipas situacionit të I-rë, raporti i pjesshëm i punës, 02-4273 dt.18.11.2025. Komisioni mbikëqyrës ka aprovuar punët sipas situacionit të II-të, raporti i pjesshëm i punës, 02-4664 dt.24.12.2025. Gjatë këtij tre mujori janë inspektuar zhvillimet e punimeve sipas planit dinamik. Për inventarë kanë bërë përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave. Kanë vazhduar punët në trajtimin e mureve, instalimet elektrike dhe IT, punët e instalimeve makinerike, instalimi i ngrohjes nën dysheme, sistemi ngrohje/ftohje VFR, klimatizimi, punët e keramikave dhe granitit, punët e dyerve dhe dritareve, punët e pllafonit të lëshuar etj. Kërkesa e Operatorit Ekonomik është aprovuar për punë shtesë dhe të paparapara dhe për zgjatjen e afatit për ekzekutimin e punimeve. Kontrata është në zhvillim.
- **Komision mbikëqyrës** - me nr. 02-628 dt.05.03.2026, është caktuar komisioni mbikëqyrës për menaxhimin e kontratës: "**Punë shtesë Renovimi i Objektit të Drejtorisë – RITENDER**", me

nr. të prokurimit IL-26-328-5-2-5, Nr. Protokoli 02-608 i datës 05.03.2026. Menaxheri i projektit PMK dhe OE kanë nënshkruar kontratën. Më dt. 05.03.2026 menaxheri i projektit ka dërguar Letrën për fillimin e punëve, me atë rast OE ka filluar punët nga dt. 05.03.2025. Komisioni mbikëqyrës ka aprovuar punët sipas situacionit të I-rë, raporti i pjesshëm i punës, 02/1-719 dt.12.03.2026. Punët e ekzekutuara janë: demolimi i mureve ndarëse dhe mveshjeve prej paneleve të drurit, punimi i mureve ndarëse me knauf, mveshja e mureve me pllaka gipsi, punët e atikës në kulm, sanimi i thyerjeve ekzistuese sipërfaqësore të shtyllave, trajeve dhe pllakës, punët e granitit, punët e llamarinës, punët e instalimeve elektrike dhe makinerike. Komisioni mbikëqyrës ka aprovuar punët sipas situacionit të II-të, raporti përfundimtar i punës, 02/1-813 dt.24.03.2026. Punët e ekzekutuara janë: punimi i mveshjeve të shtyllave me pllaka gipsi, mveshja e mureve me pllaka gipsi, punët e instalimeve elektrike dhe makinerike. Kontrata ka përfunduar.

- **Komision mbikëqyrës** - me vendim nr. 02-4625 dt. 22.12.2025, për kontratën me titull: **“Angazhimi i një zyreje projektuese për studimin e sanimit të rrëshqitjeve – RITENDER”** me numër të prokurimit IL-25-4023-2-2-1, nr. protokoli 02-4577 i datës 18.12.2025. Me OE është organizuar vizita në terren me OE, për fillimin e matjeve gjeodezike dhe fillimin e realizimit të testeve për hartimin e elaboratit gjeomekanik, hartimin e projektit kryesor për sanimin e rrëshqitjeve. Matjet gjeodezike dhe shpimet gjeoteknike janë përfunduar në Zupqe, Lushtë 1, Lushtë 2 si dhe Druar, ku janë marr mostra për analiza laboratorike dhe janë përfunduar të gjitha këto prova. Projekti është duke u hartuar. Kontrata është në zhvillim.
- **Komision mbikëqyrës** - SCADA projekti - nr. Protokollit 01-1227/1, me vendim të datës 13.06.2019. Projekt i Bankës Botërore, WSCP-G-ICB-2, që implementohet përmes kompanisë/konzorciumi: JV Inter-Adria dhe Oskar. Disa nga punët e planifikuara ende nuk janë përfunduar. Tek Kosova B nuk është montuar ende senzori i parashikuar në projekt. Gjithashtu, disa puseta, përfshirë ato tek Besia dhe Ferronikeli, shfaqin rrjedhje uji, për shkak të izolimit të pamjaftueshëm, gjë që ka rezultuar në mbushjen e tyre me ujë. Këto probleme kërkojnë ndërhyrje për të siguruar funksionimin korrekt dhe për të parandaluar dëmtime të mëtejshme.
- **Komision mbikëqyrës** - në projektin: **“Studimi i fizibilitetit për shfrytëzimin e aseteve të IL-se për prodhimin e energjisë alternative Solare”**, - nr. Protokollit 02-1807, me vendim të datës 05.06.2025. Pas dorëzimit të raportit përfundimtar të Projektit “Studimi i fizibilitetit për shfrytëzimin e aseteve të IL-se për prodhimin e energjisë alternative Solare”, i përfunduar më 17.12.2025 dhe i protokolluar më 18.12.2025 me nr. 08-4582, u paraqit nevoja për iniciimin e kërkesës pranë KEDS-it për dhënien e pëlqimit parimor. Për këtë qëllim, më 14.01.2026 u realizua vizitë zyrtare në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, ku u verifikuan të dhënat kadastrale për parcelat në pronësi të N.H.“Ibër-Lepenc”. Pas kësaj, janë përgatitur dhe dorëzuar kërkesat për tri projektet, me planet e parcelave dhe kërkesat për lista poseduese në komunat Prishtinë dhe Çagllavicë. Gjatë shqyrtimit është konstatuar mospërputhje e një pjesë të konsiderueshme e numrave të parcelave nuk përputhen me numrat që figurojnë në regjistrat komunal çka kërkon verifikim dhe harmonizim të mëtejshëm me Agjencinë Kadastrale të Kosovës.


- **Komision mbikëqyrës** – në kuadër të projektit **“Rindërtimi i segmenteve të Kanalit Besi-Graçankë – RITENDER”**, komisioni mbikëqyrës ka zhvilluar takime me operatorin ekonomik dhe është përcjellë realizimi i punimeve. Kontrata është në zhvillim.
- **Komision vlerësimi** – sipas vendimit për komisionin e vlerësimit të tenderit me titull: **“Blerja e licencave për programe profesionale AutoCAD”**, me nr. Prot. 02-432 dt.13.02.2026, më dt.13.02.2026 kanë filluar dhe përfunduar punët për vlerësimin e tenderit në fjalë.
- **Komision mbikëqyrës** - me vendim nr. 02-891 dt. 17.03.2026, është caktuar Komisioni mbikëqyrës për menaxhimin e kontratës: **“Blerja e Licencave për programe profesionale AutoCad”**, me nr. te prokurimit IL-26-307-1-3-6, Nr. Protokoli 02-891 i datës 27.03.2026. Plani për menaxhimin e kontratës është nënshkruar.
- **Komision mbikëqyrës** - me vendim nr. 02-892 dt.27.03.2026, është caktuar Komisioni mbikëqyrës për menaxhimin e kontratës: **“Blerja e licensave për programe profesionale (AutoCad Civil 3D)”**, me nr. te prokurimit IL-26-346-1-2-1, Nr. Protokoli 02/868 i datës 26.03.2026. Plani për menaxhimin e kontratës është nënshkruar.
- **Komision vlerësimi** - sipas vendimit për Komisionin e vlerësimit të tenderit me titull: **“Montimi dhe servisimi i klimave të përdorura”**, me nr. Identifikues: IL-26-226-2-3-6 dhe nr. Protokoli 02-370 të datës 09.02.2026, kanë filluar dhe përfunduar punët për vlerësimin e tenderit në fjalë.
- **Komision mbikëqyrës** - **“Montimi dhe servisimi i klimave të përdorura “**, me nr prokurimit IL-26-226-2-3-6 - nr. Protokollit 02-669, i datës 11.03.2026. Me të datës 11.03.2026, nr. Protokollit 02-673. Komisioni ka dalë në terren me datën 18.03.2026, për mbikëqyrje të punimeve gjatë montimit të klimave në Komoran dhe Shkabaj, me datën 25.03.2026, në Shkabaj dhe Mihaliq dhe me datën 27.03.2026 tek Diga Ujman. Kontrata është në zhvillim.
- **Komisioni për përgatitjen e draftit dhe plotësim ndryshimin e shenjave unike për klasifikim e dokumenteve dhe afateve të ruajtjes së tyre** - Komisioni për përgatitjen e draftit dhe plotësim-ndryshimin e shenjave unike për klasifikimin e dokumenteve dhe afatet e ruajtjes së tyre (nr. protokollit 02-4037, me vendim të datës 23.10.2025), është angazhuar në punët që lidhen me Arkivin e ndërmarrjes “Ibër-Lepenc”.  
Puna është zhvilluar në përputhje me Listën e Klasifikimit të Dokumenteve të ndërmarrjes dhe Rregulloren e MPB-së, me qëllim përgatitjen e draftit final për tërë ndërmarrjen. Në bashkëpunim me kryetarit të Komisionit Qendror, është hartuar Lista me Shenja Unike të Klasifikimit të Dokumenteve dhe afatet e ruajtjes së tyre.  
Për këtë qëllim, më 21.01.2026 u mbajt takim me përfaqësues të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, për shqyrtimin, plotësimin dhe harmonizimin e listës para miratimit dhe zbatimit të saj.
- **Komision vlerësimi** - për tenderin: **“Ndërrimi i tabelave komanduese në SP Samadregjë (Furnizim, montim dhe instalim)”** IL-26-571-1-2-1, i brendshëm IL-26-016-1-2-1. Me vendim nr.02-748, dt.17.03.2026, është caktuar komisioni dhe më dt. 17.03.2026, janë zhvilluar punët për vlerësimin e tenderit në fjalë.

- **Komisioni i vlerësimit** - për tenderin: "**Rehabilitimi i pompave në SP Samadregjë**". IL—26-562-2-2-1, i brendshëm IL-26-014-2-2-1. Me nr. 02-787, dt.19.03.2026, është caktuar komisioni dhe më dt. 19.03.2026, janë zhvilluar punët për vlerësimin e tenderit në fjalë.
- **Komision vlerësimi** - me vendim nr. 02-749 dt. 17.03.2026, është caktuar komisioni për vlerësim të tenderit "**Blerja e mjeteve specifike të punës për DPZH**".
- **Komisioni vlerësimi** – për tenderin – "**Furnizim me material zyrtar**".
- Sipas Planit të biznesit 2026: **Renovimi i stacioneve Pompikë** (revidimi pas kërkesave të reja nga shefat e njësive të departamentit të ujitjes): Samadrexhë, Pantinë, Fushticë, Gjurashin, Korroticë, Krashticë (Gllobar) ku, Sipas planit të veprimit të DPZH-së(dhe planit të Biznesit) dorëzimi I revidimit të projektit ishte i paraparë me dt.20.05.2026, është perfunduar me datë 31.03.2026 pra janë kompletuar specifikimet teknike për projektin që përfshinë renovimin e gjashtë stacioneve pompikë.
- **Komision profesional** – me vendim me nr. Identifikues 02-4105 të datës 30.10.2025 është caktuar Komisioni profesional për shqyrtim të kërkesës nga "Safari-Group". Me datë 09.01.2026 komisioni zyrtarisht i është përgjigjur kompanisë në fjalë.
- **Komision profesional** – me vendim nr. Identifikues 02-4487 të datës 09.01.2026 është caktuar Komisioni profesional për shqyrtimin e kërkesës nga "IPE-Proing". Me datë 09.01.2026 komisioni zyrtarisht i është përgjigjur kompanisë në fjalë.
- **Komision profesional** – me vendim nr. identifikues 02-552 të datës 27-02-2026 është caktuar komisioni për shqyrtim të kërkesës për shqyrtimin e punëve shtesë për renovimin të objektit të drejtorisë – RITENDER, të identifikuara nga organi mbikëqyrës. Komisioni ka kryer veprim të ndërmjetëm duke bërë analizën e çmimeve të tregut.
- **Komision profesional** – me vendim nr. Identifikues 02-548 të datës 26.02.2026 është caktuar komisioni për analizat dhe hartimin e projektit për plotësimin e nevojave të projektit paraprak të zhvilluar nga WSCPP për rehabilitim të kanalit.
- **Trajnim** – me datë 16/01/2026 nga stafi i DPZH-se kanë marr pjesë në workshop në kuadër të trajnimit mbi sigurinë e digave (të organizuar nga FLOWS and WB me kompaninë italiane Pietrangeli technical Assistance on Dam Safty Assessment and Management". Më datë 27/01/2026 dhe 10/02/2026 është mbajtur sesioni online.
- **Trajnim i stafit** – një pjesë e stafit të DPZH-se kanë vijuar trajnimin „**Menaxhimi i kontratës përmes e-prokurimit**“, i cili është mbajtur me datë 23 dhe 24 mars 2026.
- **Workshop** – me datat 27,28,29/03/2026 zyrtari nga ky departament ka marr pjesë në workshop-in për hartimin e rregullores për ura. E njëjta rregullore duhet të plotësohet edhe me ura metalike në ditët në vijim.
- Inspektim i punimeve në terren për kontratat mbikëqyrëse.
- Hartimi dhe dorëzimi i specifikave teknike me dt.26.01.2026, për "Montimin dhe servisimin e klimave të përdorura", sipas Planit të biznesit 2026.
- Hartimi dhe dorëzimi i specifikave teknike me dt. 30.01.2026, për "Blerjen e Licensave për Programe profesionale (AutoCad), sipas Planit të biznesit 2026.

- Hartimi dhe dorëzimi i specifikave teknike më dt.02.02.2026, për projektin: "Blerja e Licencave për Programe profesionale (Autocad Civil 3D- pako)", sipas Planit të biznesit 2026.
- **Kontrata për qiranë e objektit** është vazhduar dhe njëkohësisht është kryer pagesa në vlerë prej 11,978.02 euro.
- Plani i veprimit – përgatitja e planit të veprimit të aktiviteteve të shërbimeve të DPZH-së, për vitin 2026, sipas Planit të Biznesit 2026.
- Pjesëmarrja në komisione të ndryshme nga punëtorët e DPZH-së sipas vendimit.

## 2.7. Njësia zbatuese e projektit WSCP

Aktivitetet në kuadër Projektit të Bankës Botërore të raportuara gjatë tremujorit të parë për 2026 (TM1) janë pasqyruar si në vazhdim :

 NDËRMARRJA HIDROEKONOMIKE "IBËR - LEPENC" SH.A. HYDRO - ECONOMIC ENTERPRISE "IBËR - LEPENC" J.S.C. VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE "IBËR - LEPENC" D.D.	
<b>Projekti me Bankën Botërore</b>	
<b>RAPORTI TREMUJOR (TM1_2026)</b>	
<b>Emri i Kontratës:</b>	<b>Siguria e Ujit dhe Mbrojtja e Kanalit - WSCP</b>
<b>Investitori</b>	<b>N.H. "Ibër -Lepenc" Sh.A Prishtinë</b>
<b>Nën-projektet</b>	<b>1.Rehabilitimi i kanalit kryesor të „Ibër -Lepencit” 2.Konsulenca 3.SCADA</b>
<b>1. Emri i Projektit</b>	<b>Rehabilitimi i kanalit kryesor të „Ibër- Lepencit”</b>
<b>Kontraktori</b>	<b>“Famis.CO and Kit AK Gradnje”</b>
<b>Data e firmosjes së kontratës</b>	<b>24/05/2023</b>
<b>Çmimi i Kontratës:</b>	<b>12,875,191.63 €</b>

<b>2. Emri i Projektit</b>	<b>Konsulenca – Mbikqyrja e punimeve gjatë realizimit të punimeve në kanalin kryesor</b>
<b>Kontraktori</b>	<b>“IPE Proing Sh.P.K”</b>
<b>Data e firmosjes së kontratës</b>	<b>08/06/2019</b>
<b>Çmimi i Kontratës:</b>	<b>270,700.00 €</b>
<b>3. Emri i Projektit</b>	<b>Furnizimi dhe montimi i sistemit SCADA</b>
<b>Kontraktori:</b>	<b>JV Interadira &amp; OSKAR-EL</b>
<b>Data e firmosjes së kontratës</b>	<b>21/05/2019</b>
<b>Çmimi i Kontratës:</b>	<b>1,072,044.24 €</b>
<b>Vlera e punimeve të kryera:</b>	<b>899,923.20 €</b>

**Periudha Raportuese: 01.10.2026 - 31.3.2026**

Gjatë periudhës Janar – Mars, kontraktori ka zhvilluar aktivitete ndërtimore në zonën e punimeve në Zubin Potok në Segmentin B7 me gjatësi L-405 m. Punimet në këtë segment kanë filluar në mes të nëntorit 2024, me hapjen (gërmimin) e rrugës së qasjes, mirëpo punimet janë pezulluar për arsye sigurie në këtë zonë.

Gjatë periudhës së pezullimit, rrjedhja e vazhdueshme nga një gyp i kanalizimit i instaluar nga një palë e tretë ka shkaktuar shembje të dheut mbi bypass-in anësor të instaluar më parë nga Kontraktori. Kjo ka bërë të domosdoshme përdorimin e makinerisë së rëndë për të larguar dheun e shembur dhe për të rivendosur funksionalitetin e bypass-it.

Në muajin Shkurt - Mars kontraktori ka punuar me intezitet të lartë për të përfunduar punimet në gjatesin e kanalit për të përfunduar të gjithë kanalin deri me datë 31 Prill siq është i parapare.

**Aktivitetet e punës dhe raportimi i tyre**

**Punimet e rehabilitimit dhe riparimit përfshijnë si më poshtë:**

1. Rindërtimi i pjesëve të hapura të të kanalit trapezoid dhe drejtkëndësh me Beton (gjatësia totale përafërsisht 9,194.70 m në gjithsej 55 seksione, në komunat: Zubin Potok, Mitrovicë, Vushtrri, dhe Obiliq), duke ruajtur rrjedhën e panderprerë të Ujit.

2. Zëvendësimi i kanalit të hapur pranë fshatit Zubin Potok me elemente nga betoni dhe mbulesë të kanalit (gjatësia përafërsisht 405 m).

3. Ndërtimi i sektorit të dytë 2 të Rezervuarit Bufer me gjatësi 800 m dhe gjerësi 8m' .

4. Riparimi i Akuadukteve me gjatësi 24600.23m<sup>2</sup>, riparimi li sipërfaqes së brendshme të akuadukteve duke riparuar vrimat dhe aplikimin e materialit hidroizolues si shtresë e sipërme duke përfshirë trajtimin e fugave sipas Specifikimit Teknik dhe kërkesave të furnizuesit.

Numri i akuadukteve është 17 copë me gjatësi totale përafërsisht. 1,989,264.01m në komunat Zubin Potok 7, Mitrovicë 2 dhe Vushtrri 8.

5. Punime të tjera

Ndërtimi i murit mbrojtës 318 m'

Pastrimi dhe rivendosja e 41 lëshesave ekzistuese dhe ndërtimi i 10 kanaleve të reja

Ndërtimi i 21 kutive të shpërndarjes së ujit (dhoma betoni nëntokësore direkt në buzë të kanalit me marrjen e ujit nga kanali)

Instalimi i 13 rrjetave metalike në kalimine kanalit nga seksionet e kanalit të hapur në atë nëntokësor.

Punimi i gropave septike (pellgje betoni nëntokësor, 4 x 8,000L), për lidhje me shtëpitë afër kanalit.

6. Çështjet mjedisore

Ekzekutimi i punimeve të riparimit dhe rehabilitimit duhet të jetë në përputhje me Kornizën e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social (ESI AF), Kornizën e Menaxhimit Mjedisor dhe Social (ESMF), Kornizën e Politikave të Zhvendosjes (KPZH), politikat dhe procedurat e Bankës Botërore, si dhe legjislacioni.

- Kontraktori "JV Famis Co dhe Kit AK Gradnje"  
Vazhdimi i punimeve në kanalin kryesor

Pas nënshkrimit të kontratës me datën 24.05.2023, kontraktori "Famis Co dhe Kit AK Gradnje" kanë paraqitur Planin Dinamik të mobilizimit në teren dhe kanë filluar punët sipas kushteve të kontratës FIDIC, ku bazohet projekti "Rehabilitimi i kanalit kryesor të Ibër Lepencit".

Gjatë kësaj periudhe të raportimit kontraktori ka punuar me disa pozicione të punimeve:

### Kanali Trapezoidal

Deri më tani, Kontraktori ka përfunduar **7 segmente**

Deri në këtë fazë, Kontraktori ka arritur progres në segmentet e mëposhtme:

Nr	Segment No.	from	Up to	Length	Progress
1	A2.1	Km 16+540.00	Km 16+864.27	L= 324.27m	100.00%
2	A3.6	Km 27+138.37	Km 27+591.20	L=452.83m	100.00%
3	A4.2	Km 29+725.46	Km 31+190.89	L=1,465.43m	100.00%
4	A6.1	Km 36+147.52	Km 36+517.89	L= 370.37m	100.00%
5	A6.2	Km 36+631.37	Km 36+733	L= 101.20m	100.00%
6	A7.2	Km 42+266.03	Km 42+527.60	L=261.57m	100.00%
7	A7.4	Km 45+704.08	Km 46+405.13	L=701.05m	100.00%
<b>Total:</b>				<b>3,676.65 m</b>	<b>100.00%</b>

### Rehabilitimi i Akuadukteve

Kontraktori ka përfunduar rehabilitimin e 16 segmenteve të akuedukteve. Duke arritur një progres prej afërsisht 96.42% në rehabilitimin e tyre ose duke përfunduar 2,053.70 metra nga gjithsej 2,129.89 metra

No	PAK	from	Up to	Length	Progress
1	PAK1.1	Km 04+305.01	Km 04+369.35	L=64.34 m'	100.00%
2	PAK1.2	Km 05+054.00	Km 05+126.55	L=72.55 m'	100.00%
3	PAK1.3	Km 07+529.57	Km 07+586.89	L=57.32 m'	100.00%
4	PAK1.4	Km 08+542.73	Km 08+620.00	L=77.27 m'	100.00%
5	PAK1.5	Km 09+170.86	Km 09+344.39	L=173.53 m'	100.00%
6	PAK1.6	Km 09+738.08	Km 09+817.92	L=79.84 m'	100.00%
7	PAK1.7	Km 11+078.87	Km 11+114.64	L=35.77 m'	0.00%
8	PAK1.8	Km 12+497.55	Km 12+497.55	L=162.45 m'	100.00%
9	PAK2.1	Km 19+632.40	Km 19+799.26	L=166.86 m'	100.00%
10	PAK2.2	Km 20+085.68	Km 20+417.58	L=331.90 m'	100.00%
11	PAK2.3	Km 23+894.68	Km 24+033.93	L=139.25 m'	100.00%
12	PAK2.4	Km 24+894.78	Km 25+080.39	L=185.61 m'	100.00%
13	PAK2.5	Km 26+111.90	Km 26+188.67	L=76.77 m'	100.00%
14	PAK2.6	Km 27+011.97	Km 27+138.37	L=126.40 m'	100.00%
15	PAK3.3	Km 34+934.73	Km 34+975.15	L=40.42 m'	0.00%
16	PAK3.5	Km 36+517.87	Km 36+631.37	L=113.50 m'	100.00%
17	PAK4.1	Km 42+635.09	Km 42+760.74	L=125.65 m'	100.00%
18	E2A.1	Km 45+603.62	Km 45+704.08	L=100.46 m'	100.00%

**Total:** L=2,129.89 m' 100.00%

#### Kanalet drejtkëndëshe

Më 18 shkurt 2024, Kontraktori ka filluar realizimin e bypass-it, përmes kanalit anësor, në segmentin B10A.15, nga Km 47+280.00 deri në Km 47+364.47, dhe ka vazhduar me segmentet e tjera për kanalin e tipit drejtkëndor.

Nr	Segment No.	from	Up to	Length	Progress
1	B10A.15	Km 47+280.00	Km 47+364.47	L=84.47m	100%
2	B10A.16	Km 47+551.50	Km 47+620.00	L=68.50m	100%
3	B10A.17	Km 47+738.54	Km 47+869.05	L=130.51m	100%
4	B10A.18	Km 48+113.12	Km 48+378.81	L=265.69m	100%
5	B10A.19	Km 48+428.80	Km 48+496.00	L=67.20m	100%
6	B10A.19'	Km 48+604.75	Km 48+684.59	L=79.84m	100%
7	B10A.20	Km 48+854.91	Km 49+191.00	L=336.09m	100%
Total:				1,032.30	100%

### Seksioni i kanalit drejtkëndësh i mbyllur – L = 405.38m

Punimet në këtë segment kanë filluar në mes të muajit nëntor 2024, me gërmimin e rrugës së qasjes. Kontraktori është duke punuar me intensitet të lartë në këtë segment, me qëllim që punimet të përfundojnë brenda afatit kohor të paraparë sipas kushteve të kontratës.

bypass-it.

### Rehabilitimi i kanalit në përqindje (%)

Bill No. A2 - Canal Rehabilitation	length	segments	Progress		
	m'	pcs.	length	number	percentage
Canal section for trapezoidal canal type	3,676.72	7	3,676.65 m	7	100.00%
Canal section for rectangular open type	1,032.30	7	1,032.30 m	7	100.00%
Canal section rectangular closed	405.38	1	405.38 m	1	100.00%
Rehabilitation of Aqueduct	2,053.70	16	2,053.70 m	15	100.00%

### Puseta BA për SCADA

Kontraktori është në përfundim të ndërtimit të pusetës për sistemin Scada tek përfundimi i kanalit afër Kosova – B. Ka mbetur vetëm instalimi i Ujëmatsave dhe përfundimi i punëve të izolimit.

**Në vazhdim janë paraqitur disa foto të punimeve në terren:**

